

ACUSE

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



Gobierno del Estado

COPLADE
Coordinación General del
Comité Estatal de Planeación para
el Desarrollo de Oaxaca

"2019, AÑO POR LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER"

OFICIO NO:

CG- COPLADE/COMMyCS/0209/2019

ASUNTO:

REPORTE DE AVANCE

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax, 26 de marzo de 2019

LIC. RAMÓN GARCÍA ZAVALA

ENCARGADO DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE OAXACA,

EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE ACTAS DE COMITÉ DE DESARROLLO REGIONAL
PARA LAS ZONAS MINERAS EN EL ESTADO DE OAXACA.

P R E S E N T E

Me refiero a las obras aprobadas a favor del Gobierno del Estado por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del Estado de Oaxaca, en su segunda sesión ordinaria de fecha 18 de Junio del 2018:

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL PROYECTO
REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (Tercera Etapa).	\$ 2,596,790.00

Al respecto, en cumplimiento de la Guía de avance de obra, le presento a Usted de manera adjunta, el **reporte de avance físico financiero de proyecto de inversión física**, correspondientes al 25 de marzo del presente año, además se incluyen anexos documentales de la obra antes mencionada.

Lo anterior a efecto de cumplirse con lo previsto en la guía de avance de obra, se proceda a realizar los trámites respectivos para la ministración de los recursos que correspondan de acuerdo al grado de avance que se prevé en el calendario de ejecución de cada uno de los proyectos aprobados por el comité.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

COORDINADOR DE OPERACIÓN MUNICIPAL, MICRORREGIONAL
Y COINVERSIÓN SOCIAL

ALEJANDRO LEÓN CELIS

C.c.p. Lic. Sergio Vera Díaz- Coordinador General del COPLADE
Expediente y minutorio



COORDINACIÓN GENERAL DEL
COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE OAXACA
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN
MUNICIPAL, MICRORREGIONAL
Y COINVERSIÓN SOCIAL



Oficio No. SINFRA/SPPO/0036/2019

Asunto: Presentación de formato de reporte de
AVANCE DE LA OBRA: REHABILITACION
DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE
GUELATAO (TERCERA ETAPA).

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 25 de Marzo del 2019.

LIC. RAMON GARCIA ZAVALA
Encargado de la SEDATU en el Estado de
Oaxaca, en su carácter de Secretario de Actas
del Comité de Desarrollo Regional para las
Zonas Mineras en el Estado de Oaxaca.
P R E S E N T E.

Me refiero a la obra denominada Rehabilitación del Polideportivo en el Municipio de Guelatao de Juárez (Tercera Etapa), aprobada en sesión ordinaria por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del Estado de Oaxaca en 23 de Agosto de 2018, a favor del municipio de Guelatao de Juárez, Oaxaca; por la cantidad de \$2,596,790.00 (Dos millones quinientos noventa y seis mil setecientos noventa pesos 00/100 M.N.); al respecto, en cumplimiento de la Guía de Avance de Obra, le presento a Usted, de manera adjunta a este oficio, lo siguiente:

- Formato de Reporte de Avance de Obra correspondiente al mes Febrero - Marzo y sus anexos documentales de la que nos ocupa.

Lo anterior, a efecto que de cumplirse con lo previsto en la Guía de Avance de Obra, se procedan a realizar los trámites respectivos para la ministración de recursos que correspondan de acuerdo al grado de avance que se prevé en el calendario del programa del citado Proyecto aprobado por el Comité.


Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Dr. Constantino A. Pérez Morales
Subsecretario de Planeación
Y Programación de Obra



SINFRA
SUBSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN
-- OBRA

Coordinación de Operación Municipal,
Microrregional y Coinversión Social



Anexos: 01
Folio: 10

Recibí
Adriana Binos H
26/03/2019
11:00



**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE PROYECTO
DE INVERSIÓN FÍSICA**

Número de reporte: 002

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oax., a 25 de Marzo del 2019.

I.- Datos del Proyecto

- a) Nombre de la entidad federativa o municipio ejecutor o ejecutores: OAXACA, OAX.
- b) Nombre del Proyecto de Inversión Física: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)
- c) Nombre del proveedor al que se adjudica el Proyecto de Inversión Física: SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
- d) Número de ministración solicitada: 2
- e) Fecha de Inicio del Proyecto de Inversión Física: (21/12/2018) Fecha de Término Programada: (18/02/2019)
- f) Calendario de Ejecución con Recursos del Fondo Minero marcando el avance físico reportado. (Punto 5.4 de la Ficha Técnica de Identificación de Proyectos en Inversiones Físicas).
- g) Monto total del Proyecto de Inversión Física autorizado: \$ 2, 596,790.00
- h) En caso de ser un Proyecto de Inversión Física con mezcla de recursos, indica el monto total por Gobierno del Estado, Municipio y/u otros:
- Gobierno del Estado: \$ Municipio: \$ y/u otros: \$

II.- Avance Financiero

II.1.- Monto recibido en la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 2, 596,790.00	\$ 0.00	\$0.00

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

*La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración

II.2.- Monto devengado en la última ministración:

Total	Gobierno del Estado	Municipio
\$ 1,817,753.00	\$ 0.00	\$0.00

Porcentaje de avance financiero que se reporta respecto del monto total autorizado para la realización del Proyecto de Inversión Física: 70 %

III.- Avance Físico

Descripción de Avance Físico:

EL AVANCE FISICO DE LA OBRA CORRESPONDE AL 90%, LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL 25 DE MARZO DEL PRESENTE SON: ALBAÑILERIA Y ACABDOS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA DE MAERA DEPORTIVA CON SISTEMA FLOTANTE DE ALTO RENDIMIENTO, REPARACION DE CUBIERTA A BASE DE SELLADO Y AJUSTE DE LAMINA PINTO CALIBRE 22, REPARACION DE PUERTA TRASERA A BASE DE ESPESOR SOBRE ARMAGON EXISTENTE.

Porcentaje de avance físico que se reporta respecto del calendario de ejecución para la realización del Proyecto de Inversión Física: 90 %

IV.- Documentos requeridos para iniciar proceso de ministración solicitada.

*Para uso exclusivo de la DGOEFDRSEMM

DOCUMENTOS	SÍ	NO
1. Contrato de adjudicación y demás documentos de la asignación de la obra.		X
2. Fotografías a color del proyecto con pie de foto.	X	
3. Carátula de Estimaciones autorizadas.	X	
4. Facturas del proveedor.	X	
5. Formato Generador de Obra firmado por la constructora y la supervisión de obra conforme al avance físico financiero reportado	X	
6. Cuerpos de Estimación de Obra firmados por la constructora y por quién autoriza el pago del contrato.	X	

(Handwritten signature)

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

*La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración

REPORTE FOTOGRAFICO



TRAZO Y PINTADO DE LINEAS DE JUEGO



* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

* La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración

REPORTE FOTOGRAFICO



TRAZO Y PINTADO DE LINEAS DE JUEGO

(2)

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

*La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración

REPORTE FOTOGRAFICO



SELLADO ESPECIAL PARA MAPLE A BASE DE RESINAS DE POLIURETANO

C
76

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

* La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración

REPORTE FOTOGRAFICO



REPARACION DE PUERTA TRASERA

C

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

*La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDREMM para iniciar proceso de ministración

REPORTE FOTOGRAFICO



MANTENIMIENTO ENGRADAS

()

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

* La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDREMM para iniciar proceso de ministración



REPORTE FOTOGRAFICO



SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA DE MADERA DEPORTIVA

(Handwritten signature)

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.
* La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDREMM para iniciar proceso de ministración



**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE PROYECTO
DE INVERSIÓN FÍSICA**

V.- Observaciones

Se han tramitado El Anticipo y La Estimación 2 (La Estimación 1 tienen un valor de \$ 0.00)


Con base en los datos asentados en el presente Reporte de Avance Físico Financiero, se manifiesta que la ejecución de la obra descrita en el presente documento es apegada al periodo correspondiente en el calendario del programa del proyecto que nos ocupa.

Dr. Constantino A. Pérez Morales

Subsecretario de Planeación y Programación de Obra

RFC: PEMC - 550224

Centro Administrativo del Poder y Judicial "General Porfirio Díaz Soldado de la Patria" Edificio Gral. Charis Castro,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. TEL. 5016900 EXT. 25005



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME SON VERIDICOS

* El presente Reporte de Avance Físico Financiero, deberá ser llenado atendiendo a la "Guía de Entrega de Avance Físico Financiero del Proyecto de Inversión Física" en papel membretado y sellos oficiales del beneficiario.

* La documentación queda sujeta a valoración por parte de la DGOEFDRSEMM para iniciar proceso de ministración



GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA

S.A DE C.V

GCI1106134Y7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOYO, SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233
Tel. 9512434210

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

GEO621201KIA

USO CFDI: I01 - Construcciones

Factura A 509

FOLIO FISCAL (UUID)

ABA313F5-0866-48BA-8022-8213ED9A99B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406843540

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-28T16:45:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-28T16:40:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71233

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
30.00%	AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 469,662.61
0.20%	2 AL MILLAR I.C.I.C	\$ 2,699.21
3.00%	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$ 3,965.15
0.50%	5 AL MILLAR DERECHOS POR INSPECCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 6,748.03
	Total	\$ 483,075.00

ORDENADO

SF DATO

222

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	ESTIMACION 02	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (TERCERA ETAPA). MUNICIPIO: 023 GUELATAO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO DEL CONTRATO: DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019 TIPO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. Clave Prod. Serv. -81101500 Ingenieria civil Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,349,605.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 215,936.83	\$ 1,349,605.20	\$ 1,349,605.20

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

IMPORTE CON LETRA

UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 03/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 1,349,605.20

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 215,936.83

TOTAL ESTIMADO

\$ 1,565,542.03

AMORTIZACION DE ANTICIPO: 30.00%

\$ 469,662.61

2 AL MILLAR I.C.I.C 0.20%

\$ 2,699.21

3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 3.00%

\$ 3,965.15

5 AL MILLAR DERECHOS POR INSPECCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 0.50%

\$ 6,748.03

TOTAL DEDUCCIONES

\$ 483,075.00

TOTAL

\$ 1,082,467.03

Vo. Bo



RASCUAL LUZ OREA MORAN
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FABIÁN SEBASTIÁN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

AUTORIZO

RELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cRbHGNM03+wgcdVaEiYU5f0WHlcPgcFjLXW96VIMWAd9U97gPcvL71P3QYp6Wpaw9QZb8lu/BrKxUbP0E7bCcfb15+V1bvaFvyNxtsdRnQENL0nbEuEbn2kuil4LdRh3GiswIvB2hDwik76Eb+HfQJHAIj00p0CcrWfWwRwKvS1eUeYSHR0sfEJqL8FL+HfYVSTD71v5Gsk4nE86RDZTV8Ctmc8ebGAPzcDSaRq8/M6nUUQjGpT6mD3FbGkerLz+nmhg7RUNg1C6593gNkgP2sfeCY0e8KQUKgzozGySH+baHh08xLEl8+V91lg5VulKqAUBBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kj5BfmrF+e71twnEetyQjK3MbNz06NsbHRWQ28JqCwbbsk4fif8Af60yTtr0MWZymoxPQwdW5LPcMLR0CJ0DH05JV8dd7PydrLitiDwLdyEWMaQK7INIK3EDhS5dV4LW0CRMEyelnB0rD/4lmISJ0GzuDXLnZV/khliri1OGnz2mv3/ur3KScsXSdfETJbqWm2NqZ1K6VzUxcDmiIKD/0kuR4P1xsxzOBu0Q2T+Uj1+HxH8KWiJSMIP0j5ky/0ApgjhuJldlyRt1aSrmevuglhkMmoqJlyXhB+aLr4BG8x4e/O29AwGyAgpYFTGnv8VxiqKCCMoFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

111ABA313F5-0866-48BA-8022-8213ED9A99B72019-02-28T16:45:47SVT110323827icRbHGNM03+wgcdVaEiYU5f0WHlcPgcFjLXW96VIMWAd9U97gPcvL71P3QYp6Wpaw9QZb8lu/BrKxUbP0E7bCcfb15+V1bvaFvyNxtsdRnQENL0nbEuEbn2kuil4LdRh3GiswIvB2hDwik76Eb+HfQJHAIj00p0CcrWfWwRwKvS1eUeYSHR0sfEJqL8FL+HfYVSTD71v5Gsk4nE86RDZTV8Ctmc8ebGAPzcDSaRq8/M6nUUQjGpT6mD3FbGkerLz+nmhg7RUNg1C6593gNkgP2sfeCY0e8KQUKgzozGySH+baHh08xLEl8+V91lg5VulKqAUBBA==00001000000413073350]]



Ofrezca la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación



Viernes 15 de Marzo del 2019, 9:58:37 AM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente	113343025
Razón Social	GOB EDO OAX SRIA D LAS INFRAES Y EL

Su transferencia ha sido **Aplicado** con número de autorización **173203**.

Autorizadores	Usuario 01	G NIEVES ARAGON MTZ
---------------	------------	---------------------

Cuentas	Cuenta retiro	
	SIOTS SEDATU 2018 - 7013/7717660	
	Cuenta de depósito o beneficiario	
	BANORTE/IXE - MXN 072610008942325810	Nombre: GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA SA DE CV

Datos de la transferencia	Importe MXN	\$ 1,000,000.00
	Referencia Numérica	101448
	Concepto del pago	FAC A509 CLC 222 - PAGO PARCIAL
	Clave de rastreo	085901732030307494
	Tipo de cuenta	CLABE
	Tipo de beneficiario	Persona Moral
	Fecha de aplicación	Mismo Día
Fecha valor	15/03/2019	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

RECIBIDO
12 MAR 2019
11:30

OFICIALÍA DE PARTES

GUILLERMINA NIEVES ARAGÓN MARTÍNEZ.
Directora Administrativa.
Edificio.

ÁREA:	DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA
NUMERO	SIOTS/SSOP/DCEOP/493/2019
ASUNTO:	TRÁMITE DE ESTIMACION.

Secretaría de las Infraestructuras y el
Ordenamiento Territorial Sustentable
Reyes Mantecón, san Bartolo Coyotepec, Oax, a 07 de marzo de 2019.

En virtud que la Dirección de Construcción, con fundamento en el artículo 65 fracciones II y VI del Reglamento interno de la Secretaría, ha validado la documentación que ampara la **ESTIMACIÓN 2 (DOS)**, relativa al contrato de la obra pública núm.: **J03-174-03-06-465-00-2018**, de fecha 19 de Diciembre de 2018 denominada: **REHABILITACION DEL POLIDEPORTICO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)**, OAXACA, contratada con numero de obra: **SEDATU/2576/2018**, por esta Secretaría con la constructora: **GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.**

De lo anterior envío la siguiente documentación para su trámite correspondiente:

- Factura electrónica original N° A 509 con un monto de \$ 1,565,542.03

Cabe hacer mención que el avance físico de la obra de acuerdo al monto ejecutado es del 60 % según documentación soporte de la **ESTIMACIÓN 2**, avalada por la Dirección de Construcción.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ."

OLEGARIO ERASMO SOTO CRUZ
DIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE OBRA PÚBLICA

C.c.p.-

Fabián Sebastián Herrera Villagómez.- Secretario de SINFRA.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Moran.- Sub Secretario de obras Publicas.- mismo fin
Felipe Adalberto Hernández León.- Director de Construcción.- mismo fin
Marco Antonio Soto Gil.- Coordinador Técnico.- mismo fin
Expediente y Minutario.

SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE
RECIBIDO
12 MAR 2019
11:39
COORDINACION TECNICA

DESC/AMA

Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial "General
Porfirio Díaz Soldado de la Patria"
Edificio Gral. Heliodoro Charis Castro,
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
Teléfono conmutador 50 169 00 ext: 25638



GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA

S.A DE C.V

GCI1106134Y7

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOJO, SANTA CRUZ
XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233
Tel. 9512434210

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

GEO621201KIA

USO CFDI: I01 - Construcciones

Factura A 509

FOLIO FISCAL (UUID)

ABA313F5-0866-48BA-8022-8213ED9A99B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000406843540

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-28T16:45:47

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-28T16:40:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

71233

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
30.00%	AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 469,662.61
0.20%	2 AL MILLAR I.C.I.C	\$ 2,699.21
3.00%	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	\$ 3,965.15
0.50%	5 AL MILLAR DERECHOS POR INSPECCION DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	\$ 6,748.03
	Total	\$ 483,075.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	ESTIMACION 02	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (TERCERA ETAPA). MUNICIPIO: 023 GUELATAO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO DEL CONTRATO: DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019 TIPO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.	\$ 1,349,605.20	\$ 1,349,605.20

Clave Prod. Serv. -8T101500 Ingeniería civil

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 1,349,605.20 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 215,936.83

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

IMPORTE CON LETRA

UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 03/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

1 - Ingreso

03 - Transferencia electrónica de fondos

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 1,349,605.20

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 215,936.83

TOTAL ESTIMADO

\$ 1,565,542.03

AMORTIZACION DE ANTICIPO 30.00%

\$ 469,662.61

2 AL MILLAR I.C.I.C 0.20%

\$ 2,699.21

3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR

\$ 3,965.15

REMUNERACIONES AL TRABAJO

PERSONAL 3.00%

\$ 6,748.03

5 AL MILLAR DERECHOS POR INSPECCION

\$ 6,748.03

DE LA SECRETARIA DE

LA FUNCION PUBLICA 0.50%

\$ 483,075.00

TOTAL DEDUCCIONES

\$ 1,082,467.03

TOTAL

Vo. Bo

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
C. LIZBETH BAUTISTA MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

RASCAL LUZ ORTA MORAN
SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

FABIÁN SEBASTIÁN HERRERA VILLAGOMEZ
SECRETARIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

AUTORIZO

FELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON
DIRECTOR DE CONSTRUCCION

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cRbHGNM03+wcqdVaEiYU5i0/WHlcPgcFjLXW96ViMWAd9U97gPcvL71P3QYp6Wpaw9OZb8lu/BrKxUbP0E7bCcfib15+V1bvaFvyNxtsdRnQuENLOnbEuEbn2kuill4Ld
Rh3GiSwiaviB2hDwik76Eb+HhQJHAjI00p0CcrWfwrWkV51eIUeYSHR0sfEJqL8FL+/HfYVSTD71v5GsK4nE86RDZTV8Ctmc8ebGAPzcDSaRq8/M6nUUQjGpT6mD3F
bGkerLz+nmhg7RUNg1C6593gNkgP2sfeCY0e8KQKqGZozGySH+/bAHh08xLEI8+V91g5VulKqA/UBBA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kj5BImrF+o71wnEetyQjK3MnZcdNsbHRWQ28qJqCwbsck4/f8Af60yTTr0MWZymoxPQwdW5LPcMLR0CJ0DH05JV8dd7PydrLiliDwLdyEWMaQK7INIK3EDH5S5dV4L
W0CRMEyeINB0rD/4ImtSJ0GcuZDLnZV/khili10GnZ2mV3/uR3KScsXSdFETJbqwlM2NqZ1K6VzUxcDMiIKD/0kuR4P1xSxzOBuQo2T+Uji+HxH8KwiJSMIP0j5ky/0A
pgjhlujJdlyRi1aSsrmevuglhnJmnoqlJyXhB+alr4BG8x4e/O29AwGyAgpyFTGnv8VxiqKCCMoFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ABA313F5-0866-48BA-8022-8213ED9A99B7|2019-02-28T16:45:47|SVT110323827|cRbHGNM03+wcqdVaEiYU5i0/WHlcPgcFjLXW96ViMWAd9U97gPcvL71P3QYp6Wpaw9OZb8lu/BrKxUbP0E7bCcfib15+V1bvaFvyNxtsdRnQuENLOnbEuEbn2kuill4LdRh3GiSwiaviB2hDwik76Eb+HhQJHAjI00p0CcrWfwrWkV51eIUeYSHR0sfEJqL8FL+/HfYVSTD71v5GsK4nE86RDZTV8Ctmc8ebGAPzcDSaRq8/M6nUUQjGpT6mD3FbGkerLz+nmhg7RUNg1C6593gNkgP2sfeCY0e8KQKqGZozGySH+/bAHh08xLEI8+V91g5VulKqA/UBBA=||00001000000413073350||

FACTURA INTELIGENTE CFDI
Proveedor Autorizado de Certificación

Ofrece la mejor solución en Facturación Electrónica
Más información en: www.facturainteligente.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

3

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="71233" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="1082467.03"
Moneda="MXN" SubTotal="1349605.2"
Certificado="MIHhDCCBGyAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDY4NDM1NDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
NoCertificado="00001000000406843540" FormaPago="03"
Sello="cRbHGNM03+wqedVaEtYU5f0/WHIcPgeFjLXW96ViMWIAd9U97gPevL71P3QYp6Wpaw9OZb8Iu/BrKxUbP0E7bCcftb15+V1bvaFvyNxtsdRNquENLOi
Fecha="2019-02-28T16:40:29" Folio="509" Serie="A" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V." Rfc="GCI1106134Y7"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA" Rfc="GEO621201KIA" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="1349605.2" ValorUnitario="1349605.2" Descripción="NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL POLIDEPORTIVO
    EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUÁREZ (TERCERA ETAPA). MUNICIPIO: 023 GUELATAO DE JUÁREZ No. DE CONTRATO: J03-174-
    03-06-465-00-2018 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018 PERIODO DEL CONTRATO: DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO
    DE 2019 TIPO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO." Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
    Cantidad="1" NoIdentificacion="ESTIMACION 02" ClaveProdServ="81101500" ClaveUnidad="E48">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="215936.832000" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1349605.2"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="215936.83">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="215936.83" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="483075.00" Version="1.0">
      <implocal:RetencionesLocales Importe="469662.61" TasaRetencion="30.00" ImplLocRetenido="AMORTIZACION DE ANTICIPO"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="2699.21" TasaRetencion="0.20" ImplLocRetenido="2 AL MILLAR I.C.I.C"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="3965.15" TasaRetencion="3.00" ImplLocRetenido="3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
      REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL"/>
      <implocal:RetencionesLocales Importe="6748.03" TasaRetencion="0.50" ImplLocRetenido="5 AL MILLAR DERECHOS POR INSPECCION DE LA
      SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


* Datos obligatorios

RFC del emisor

GCI1106134Y7

Folio fiscal

ABA313F5-0866-
48BA-8022-
8213ED9A99B7

Total del CFDI

\$1,082,467.03

Nombre o razón social del
emisorGRUPO CONSTRUCTOR
ITHADAR DE OAXACA S.A DE
C.V

Fecha de expedición

2019-02-28T16:40:29

Efecto del comprobante

Ingreso

RFC del
receptor

GEO621201KIA

Fecha
certificación
SAT2019-02-
28T16:45:47

Estado CFDI

Vigente

Nombre o
razón social
del receptorGOBIERNO DEL
ESTADO DE
OAXACAPAC que
certificó

SVT110323827

Estatus de
cancelaciónCancelable sin
aceptación

Imprimir

Oaxaca
 JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

 ESTADO DE
 CUENTA

 SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 SUSTENTABLE.

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA


SINFRA
 Secretaría de las Infraestructuras
 y el Ordenamiento Territorial
 SUSTENTABLE

 Obra:
 REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE
 JUAREZ (TERCERA ETAPA)

 Localidad: 001 GUELATAO DE JUAREZ
 Municipio: 035 GUELATAO DE JUAREZ
 Estado: OAXACA

 Recurso: RAMO 10-ECONOMIA FONDO MINERO
 REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO

 Monto Contratado: \$
 Monto del Anticipo: \$

Monto del Convenio:

Total Contratado:

Estimación Número: 02(DOS)

 2,593,696.36
 778,108.91

R.F.C.

Domicilio:

Teléfono:

Fecha de Elaboración:

Contralista:

OCE140522076

CALLE MORELOS NUMERO 8 COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOYO, SANTA CRUZ XOYOCOTLAN, OAXACA

C.P. 71238

Tel. Fax:

Núm. De Hoja:

1/1

01 DE FEBRERO DE 2019

21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

AL

AL

De Fecha: 19 de Diciembre de 2018

De Fecha:

De Fecha:

Número de Contrato: J03-174-03-06-465-00-2018

Número de Convenio de Diferimiento:

Número de Convenio:

Estimación Número	Periodo	Importe de la Estimación NORMAL	16 % DE I.V.A.	Total Bruto	Amortización Anticipo	Deducciones			Líquido a Pagar
						5 al Millar D.I.S.F.P.	2 al Millar I.C.I.C.	3% ARTICULO 63 L.E.H. (NOMINA)	
01 (UNO)	DEL 21 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02(DOS)	DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019	\$1,349,605.20	\$215,936.83	\$1,565,542.03	\$469,662.61	\$6,748.03	\$2,699.21	\$3,965.15	\$1,082,467.03
Totales:		\$1,349,605.20	\$215,936.83	\$1,565,542.03	\$469,662.61	\$6,748.03	\$2,699.21	\$3,965.15	\$1,082,467.03

Saldo de Contrato por Ejercer: \$ 1,028,154.33

LABOR:

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

LICENCIADO EN INGENIERIA CIVIL

ARQ. FRANCISCO CONSTANZO VASQUEZ SANTAMARIA

RESIDENTE DE OBRA DE LA SIOT

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

ARQ. FELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

ARQ. FELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

ARQ. FELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

ARQ. FELIPE ADALBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SUSTENTABLE.
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA



SINFRA
Secretaría de las Infraestructuras
y el Ordenamiento
Territorial Sustentable

Obra: **REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)**

Localidad: 001 GUELATAO DE JUAREZ

Municipio: 035 GUELATAO DE JUAREZ

Estado: 020 OAXACA

Recurso: RAMO 10-ECONOMIA, FONDO MINERO

Numero de Contrato: J03-174-03-06-465-00-2018

Numero de Convenio de Diferimiento:

Monto Contratado: \$ 2,593,896.36

Monto del Anticipo: \$ 778,108.91

Contratista: R.F.C.

Domicilio: OAXACA, CP 7123

Teléfono: 5170883

Tel. Fax:

Fecha de Elaboración: 01 DE FEBRERO DE 2019

Núm. De Hoja: 1/1

Periodo de Ejecución: 01 DE ENERO DE 2019 AL 31 DE ENERO DE 2019

De Fecha: 19 de Diciembre de 2018

Periodo de Contrato: 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

Periodo de Convenio:

Clave	Partida	Estimado		Deducciones		Neto a Recibir	
		Subtotal de Partidas	Pagado hasta Estimación Anterior Acumulado	Concepto	Importe de la Partida de Contrato	Concepto	Monto

A REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO

A01 CANCHA DE BASQUETBOL

A0101	PRELIMINARES	\$0.00	\$0.00		\$75,061.23 AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO		\$469,662.61
A0102	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	\$1,307,860.97	\$0.00		\$2,077,922.51 5 al Millar D.I.S.F.P.		\$6,748.03
A02	ADHERIDOS	\$41,944.23	\$0.00		\$82,961.40 2 al Millar I.C.I.C.		\$2,699.21
					3% ARTICULO 63 LEH. (NOMINA)		\$3,965.15

SUBTOTAL: \$1,349,805.20

16% DE IVA: \$215,936.83

TOTAL: \$1,565,542.03

\$483,075.00

TOTAL DEDUCCIONES:

\$483,075.00

TOTAL ESTIMADO: \$1,565,542.03

MEINOS DEDUCCIONES: \$483,075.00

NETO A RECIBIR: **\$1,082,467.05**

Neto a Recibir con Letra: ("UN MILLON OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 06/100 M.N.") IVA INCLUIDO

ELABORÓ:

AUTORIZÓ:

VO. BO.

VO. BO.

VO. BO.

GRUPO CONSTRUCTORES ITIHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
LIC. IZABEL BRICEGOSA MARTÍNEZ
DIRECCION DE CONSTRUCCION
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA
CALLE MORELOS NUMERO 8 COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOYOOTLAN, OAXACA, CP 7123
TEL. 5170883 FAX 5170983

Obra:	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)		Monto Contratado:	\$2,593,696.36	Contratista:	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V			
Localidad:	001 GUELATAO DE JUAREZ		Monto del Anticipo:	\$778,108.91	R.F.C.	GCI1106134Y7			
Municipio:	035 GUELATAO DE JUAREZ		Monto del Convenio:		Domicilio:	CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA.			
Estado:	020 OAXACA		Total Contratado:		C.P.	71233			
	Recurso: RAMO 10-ECONOMIA, FONDO MINERO, REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO		Estimación Numero:	02 (DOS)	Teléfono:	5170983			
					FAX:	5170983			
Numero de Contrato:	J03-174-03-06-465-00-2018		Periodo de Ejecución:	01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019	Fecha de Elaboración:	01 de Febrero de 2019			
Numero de Convenio Diferimiento:			De Fecha:	19 de Diciembre de 2018	Periodo de Contrato:	21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019			
Numero de Convenio Modificador:			De Fecha:		Periodo de Convenio:				
			De Fecha:		Periodo de Convenio:				
Clave	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Cantidad de Presupuesto	Acumulado Anterior	Presente	Acumulado	Excedente	Importe Estimado
A	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO								
A01	CANCHA DE BASQUETBOL								
A0102	ALBAÑILERIA Y ACABADOS								
2576-003	Suministro y colocación de Duela de Madera Deportiva con sistema flotante de alto rendimiento: se colocara una barrera de vapor a base de una película de polietileno de alta densidad de 6 mil. de espesor, se instalaran 2 camras de hojas de madera OSB o Triplay de 1.22x2.44m y 1/2" pulgada de espesor, la primera cama en línea y a lo largo de el área y en la parte inferior de esta se instalaran cojinetes de hule de 3/8 de peralte, esto para tener un sistema amortiguador flotante, la segunda cama de hojas se colocara a 45° de la primera, se colocara duela de maple americano de tercer grado clavada a la cama de madera por un canto a 45°, se prosedera a devastar la superficie con mallas de fibra de carbon de grado 100 y 120, se aplicara una capa de sellador especial para maple a base de resinas de poliuretano, se procedera a pulir toda la superficie y a limpiarla con thinner mineral, se procedera al trazo y pinitado de líneas de juego reglamentarias de la diciplina solicitada, se aplicara unas capas de poliuretano transparente brillante y antideslante especial para áreas deportivas como acabado final incluye: Duela de maple, aglomerado OSB, tornillos, taquetes, clavos, pintura, lijas, thinner mineral, barniz para maple, película de polietileno, cojinetes de hule, suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	\$ 2,530.01	821.31	0.00	516.86	516.86	0.00	\$1,307,660.97
A0102	TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS								

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

ARQ. FRANCISCO CONSTANZA VASQUEZ SANTA MARIA

RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

ARQ. FELIPE ADAMBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

Obra:

REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Localidad:

001 GUELATAO DE JUAREZ

Municipio:

035 GUELATAO DE JUAREZ

Estado:

020 OAXACA

Recurso:

RAMO 10 ECONOMIA, FONDO MINERO, REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO

Monito Contratado:

\$2,593,696.36

Monito del Anticipo:

\$778,108.91

Monito del Convenio:

Total Contratado:

Estimación Numero:

02 (DOS)

Periodo de Ejecución:

01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019

Contratista:

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.

R.F.C.:

GC11061347

Domicilio:

CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233

Teléfono:

5170983

FAX:

5170983

Fecha de Elaboración:

01 de Febrero de 2019

Numero de Hoja:

2 DE 2

Numero de Contrato:

J03-174-03-06-465-00-2018

Numero de Convenio Diferimiento:

-

Numero de Convenio Modificatorio:

-

De Fecha:

19 de Diciembre de 2018

De Fecha:

21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

De Fecha:

Periodo de Convenio:


De Fecha:

Periodo de Convenio:

Clave	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Volumen			Importe Estimado
				Cantidad de Presupuesto	Acumulado Anterior	Presente	
A02	ADHERIDOS						
2576-004	Reparación de cubierta a base del sellado y ajuste de lamina pintor calibre 22 hasta una altura de 15 mts, sellado de aberturas con silicon industrial de alta temperatura, fijación de laminas sueltas y reposición de laminas dañadas, incluye suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	\$ 99.50	421.55	0.00	421.55	\$41,944.23
A02	TOTAL ADHERIDOS						\$41,944.23

SUBTOTAL	\$1,349,605.20
IVA 16 %	\$215,936.83
TOTAL	\$1,565,542.03


ELABORÓ:



FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTA MARIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

AUTORIZÓ:



ADALBERTO HERNANDEZ LEON

DIRECTOR DE CONSTRUCCION

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

Obra: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Localidad: 001 GUELATAO DE JUAREZ Recurso: RAMO 10-ECONOMIA, FONDO MINERO
Municipio: 035 GUELATAO DE JUAREZ REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO
Estado: 020 OAXACA

Numero de Contrato: J03-174-03-06-465-00-2018

Numero de Convenio Diferimiento:

Numero de Convenio Modificador:

Monto Contratado: \$2,593,686.36
Monto del Anticipo: \$778,108.91
Monto del Convenio:
Total Contratado:

Estimacion Numero: 02 (DOS)
Periodo de Ejecucion: 01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019

De Fecha: 19 de Diciembre de 2018

De Fecha:

De Fecha:

Contratista: GRUPO CONSTRUCTOR ITIHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.
Domicilio: CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233
R.F.C. GCI1106134Y7
Teléfono: 5170983
Tel. Fax: 5170983

Fecha de Elaboración: 01 de Febrero de 2019
Numero de Hoja: 1/1

Periodo de Contrato: 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

Periodo de Convenio:

Periodo de Convenio:

Periodo de Convenio:

CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACION			DESARROLLO				DESCUENTO			PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES
		Eje	Tramo	Area	ml largo	diámetro ancho	kg/ml altura	alto	largo	ancho	alto				
A A01 A0102 2576-003	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO CANCHA DE BASQUETBOL ALBANILERIA Y ACABADOS	A-8 A	1-10 1-10		38.97	13.5							526.10 -9.24		MEJORA AREA DE TRIANGULOS DE ESQUINAS
A02 2576-004	ADHERIDOS Reparacion de cubierta a base del sellado y ajuste de lamina pinto calibre 22 hasta una altura de 15 mts, sellado de aberturas con silicon industrial de alta temperatura, fijacion de laminas sueltas y reposicion de laminas dañadas, incluye suministro de materiales y herramienta mano de obra, equipo y herramienta	A-8	1-10		39.66	10.63							421.59	M2	PARA EFECTOS DE COBRO SE TOMARAN 421.55 M2 RESTANDO 0.04 M2 LO CUAL SE COBRARA PARA LA SIGUIENTE ESTIMACION
													421.55	M2	PARA EFECTOS DE COBRO SE TOMARAN 421.55 M2 RESTANDO 0.04 M2 LO CUAL SE COBRARA PARA LA SIGUIENTE ESTIMACION

AUTORIZA:

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTA MARIA
RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

GRUPO CONSTRUCTOR ITIHADAR DE OAXACA S.A DE C.V.
LIZBETH BAUTISTA MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL




SUSTENTABLE

Localidad:	001 GUELATAO DE JUAREZ	Recurso:	RAMO 10-ECONOMIA. FONDO MINERO REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO
Municipio:	035 GUELATAO DE JUAREZ		
Estado:	020 OAXACA		
Numero de Contrato:	J03-174-03-06-465-00-2018		
Numero de Convenio Diferimiento:			
Numero de Convenio Modificador:			

Obra:	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)
Monto Contratado:	\$2,593,696.36
Monto del Anticipo:	\$778,108.91
Total Contratado:	
Estimación Numero:	02 (DOS)
Periodo de Ejecución:	01 de Enero de 2019 AL 31 de Enero de 2019
De Fecha:	19 de Diciembre de 2018
De Fecha:	

CLAVE	CONCEPTO
A	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO
A01	CANCHA DE BASQUETBOL
A0102	ALBANILERIA Y ACABADOS
2576-003	


Suministro y colocación de Duela de Madera Deportiva con sistema flotante de alto rendimiento: se colocara una barrera de vapor a base de una película de polietileno de alta densidad de 6 mil. de espesor, se instalaran 2 camas de hojas de madera OSB o Triplay de 1,22x2,44m y 1/2" pulgada de espesor, la primera cama en línea y a lo largo de el área y en la parte interior de esta se instalaran cojinetes de hule de 3/8 de pulgada, esto para tener un sistema amortiguador flotante, la segunda cama de hojas se colocara a 45° de la primera, se colocara duela de maple americano de tercer grado clavada a la cama de madera por un canto a 45°, se procederá a devastar la superficie con mallas de fibra de carbono de grado 100 y 120, se aplicara una capa de sellador especial para maple a base de resinas de poliuretano, se procederá a pulir toda la superficie y a limpiarla con thinner mineral, se procederá al trazo y pintado de líneas de juego reglamentarias de la disciplina solicitada, se aplicara unas capas de poliuretano transparente brillante y antiderrapante especial para áreas deportivas como acabado final incluye: Duela de maple, aglomerado OSB, tornillos, clavos, pintura, lijás, thinner mineral, barniz para maple, cojinetes de hule, suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta.

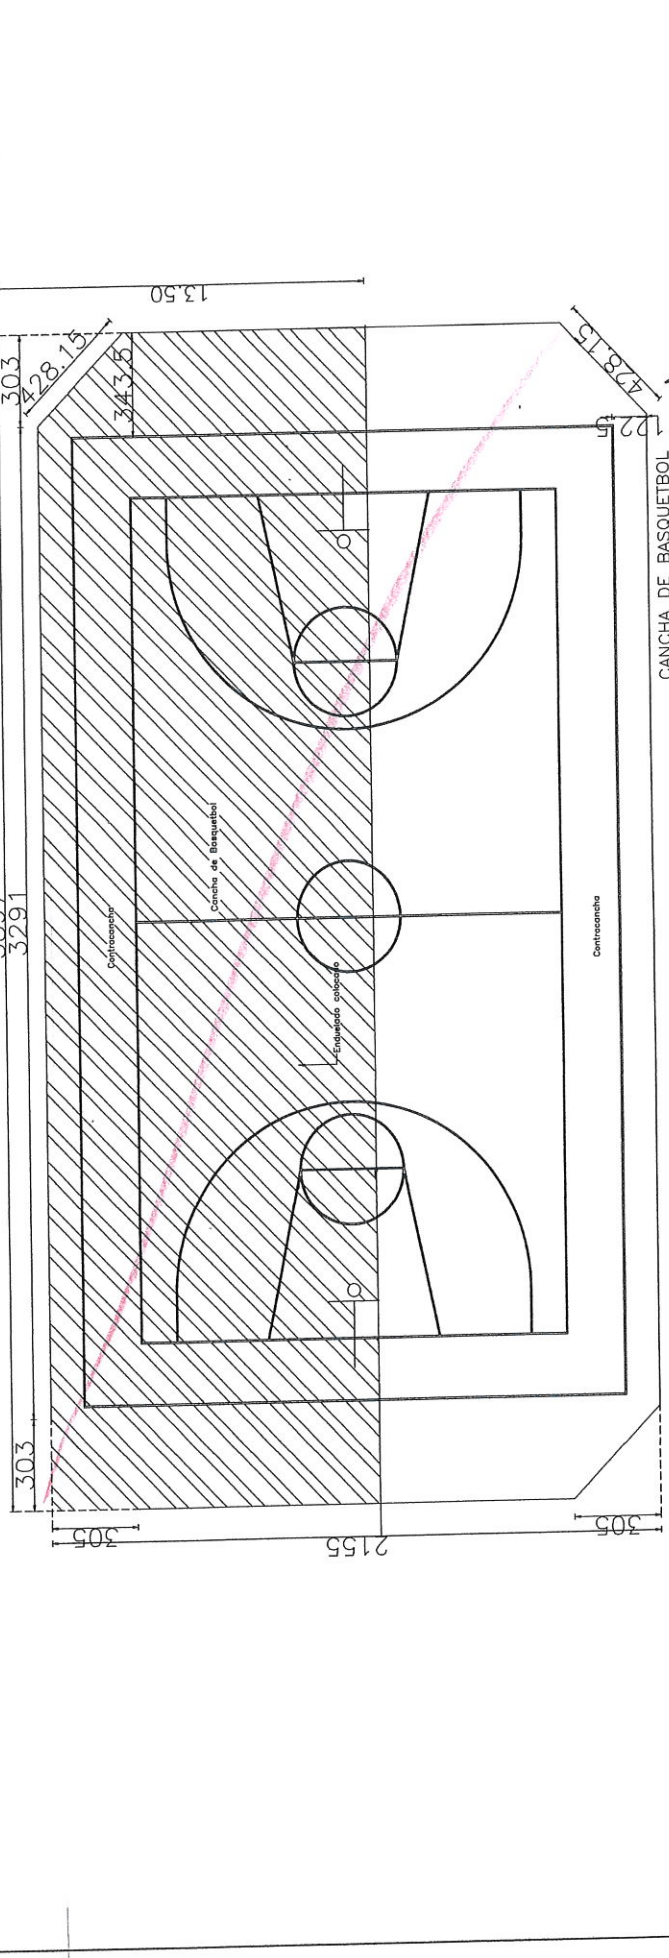

Obra:	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)		Monto Contratado:	\$2,593,696.36	Contratista:	GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.	
Localidad:	001 GUELATAO DE JUAREZ	Recurso:	RAMO 10-ECONOMIA, FONDO MINERO REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO	Monto del Anticipo:	\$778,108.91	Domicilio:	CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233
Municipio:	035 GUELATAO DE JUAREZ			Total Contratado:		R.F.C.:	GCI1106134Y7
Estado:	020 OAXACA			Estimación Número:	02 (DOS)	Teléfono:	5170983 Tel. Fax:
Número de Contrato:	J03-174-03-06-465-00-2018			Periodo de Ejecución:	01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019	Fecha de Elaboración:	01 de Febrero de 2019
Número de Convenio Diferimiento:				De Fecha:	19 de Diciembre de 2018	Periodo de Convenio:	2 de 2
Número de Convenio Modificatorio:				De Fecha:		Periodo de Contrato:	21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

CLAVE	CONCEPTO	CROQUIS	VOLUMEN	UNIDAD
-------	----------	---------	---------	--------

A02	ADHERIDOS			
2576-004	Reparación de cubierta a base del sellado y ajuste de lamina pinto calibre 22 hasta una altura de 15 mts, sellado de aberturas con silicon industrial de alta temperatura, fijacion de laminas sueltas y reposicion de laminas dañadas. incluye suministro de materiales y herramienta mano de obra, equipo y herramienta		421.59	M2

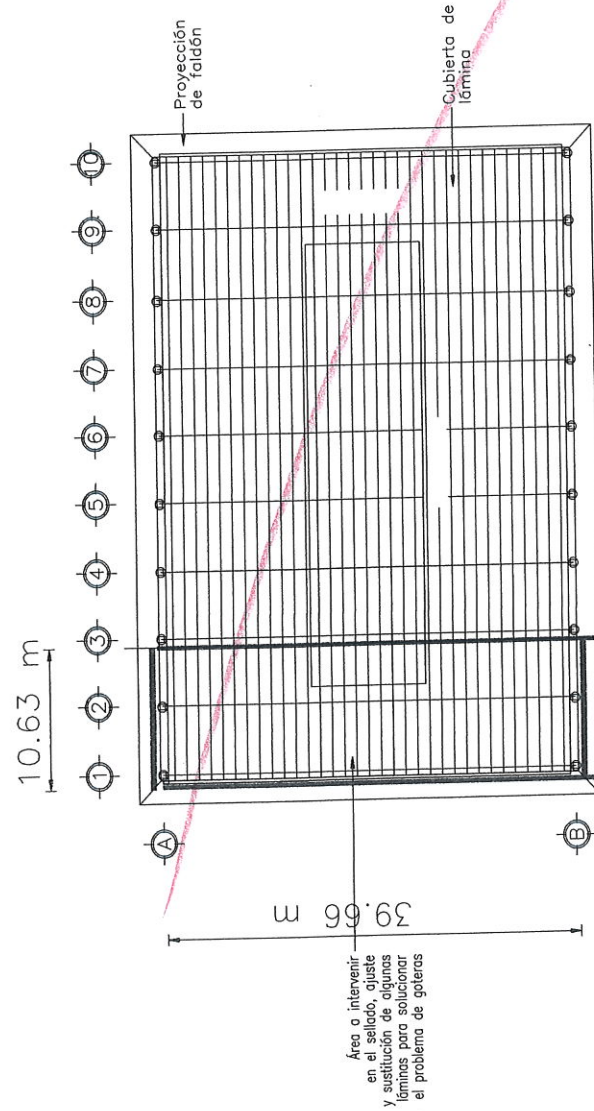

REPARACIÓN CUBIERTA

PLANTA
ESC. 1:500



LIC. LIZBETH BAUTISTA MARTINEZ
GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR ÚNICO

AUTORIZADO:

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

Obra:

REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Localidad: 001 GUELATAO DE JUAREZ Recurso: RAMO 10-ECONOMIA FONDO
Municipio: 035 GUELATAO DE JUAREZ MINERO REHABILITACION DEL
Estado: 020 OAXACA POLIDEPORTIVO

Numero de Contrato: J03-174-03-06-465-00-2018

Numero de Convenio Diferimiento:

Numero de Convenio Modificatorio:

Monto Contratado: \$2,593,696.36

Contratista:

Domicilio:

\$778,108.91

Monto del Anticipo:

Monto del Convenio:

Total Contratado:

Estimación Número: 02 (DOS)

Periodo de Ejecución: 01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019

19 de Diciembre de 2018

De Fecha:

De Fecha:

De Fecha:

R.F.C.:

GC1106134Y7

Teléfono:

5170983 Tel. Fax:

Numero de Hoja:

1 de 6

Periodo de Contrato:

21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

Periodo de Convenio:

Periodo de Convenio:

Periodo de Convenio:

Periodo de Convenio:

FOTOS

CONCEPTO

CLAVE

REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO

A CANCHA DE BASQUETBOL

A01 ALBANILERIA Y ACABADOS

2576-003


Suministro y colocación de Duela de Madera Deportiva con sistema flotante de alto rendimiento: se colocara una barrera de vapor a base de una película de polietileno de alta densidad de 6 mil. de espesor: se instalaran 2 camisas de hojas de madera OSB o Triplay de 1.22x2.44m y 1/2" pulgada de espesor, la primera cama en línea y a lo largo de el área y en la parte inferior de esta se instalaran cojinetes de hule de 3/8 de pulgada, esto para tener un sistema amortiguador flotante, la segunda cama de hojas se colocara a 45° de la primera, se colocara duela de maple americano de tercer grado clavada a la cama de madera por un canto a 45°, se procederá a devastar la superficie con mallas de fibra de carbono de grado 100 y 120, se aplicara una capa de sellador especial para maple a pulir toda la superficie y a limpiarla con thinner mineral, se procederá al trazo y pintado de líneas de juego reglamentarias de la disciplina solicitada, se aplicara unas capas de poliuretano transparente brillante y antideslante especial para áreas deportivas como acabado final incluye: Duela de maple, aglomerado OSB, tornillos, taquetes, clavos, pintura, lijás, thinner mineral, barniz para maple, película de polietileno, cojinetes de hule, suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta.

VOLUMEN


516.86

UNIDAD

M2

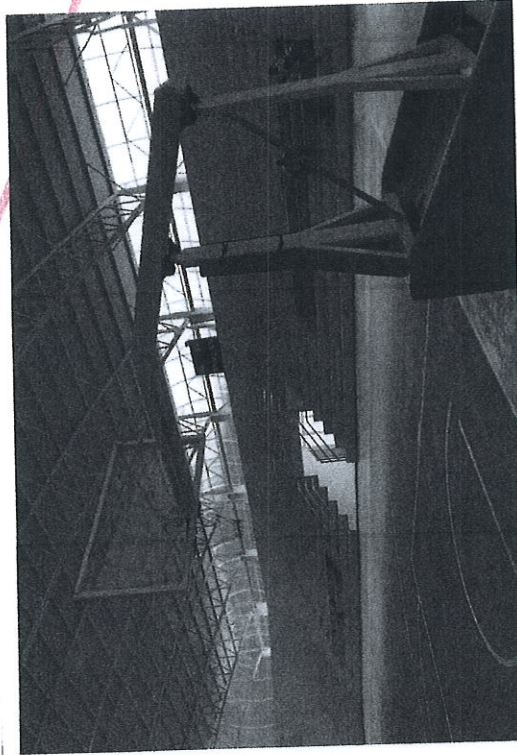

ANTES 17°18'42.85"N 96°29'30.72"O

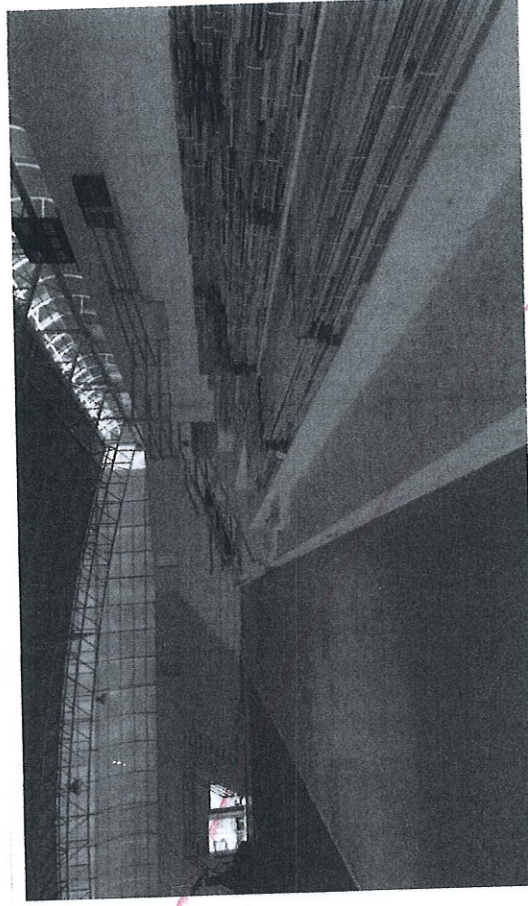

ANTES 17°18'44.07"N 96°29'29.40"O



ITIHADAR
LIC. IZBETH BAUTISTA MARTINEZ
GRUPO CONSTRUCTOR ITIHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO


AUTORIZO:

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTA MARIA
RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

Obra:	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)			
Localidad:	001 GUELATAO DE JUAREZ	Recurso:	RAMO 10-ECONOMIA, FONDO	
Municipio:	035 GUELATAO DE JUAREZ		MINERO REHABILITACION DEL	
Estado:	020 OAXACA.		POLIDEPORTIVO	
Numero de Contrato:	J03-174-03-06-465-00-2018			
Numero de Convenio Diferimiento:				
Numero de Convenio Modificatorio:				
Monto Contratado:	\$2,593,696.36			
Monto del Anticipo:				
Monto del Convenio:	\$778,108.91			
Total Contratado:				
Estimación Numero:	02 (DOS)			
Periodo de Ejecución:	01 de Enero 2019	AL	31 de Enero de 2019	
Fecha de Elaboración:	01 de Febrero de 2019			Numero de Hoja: 3 de 6
Periodo de Contrato:	21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019			
Periodo de Convenio:				
Periodo de Conveglio:				

CLAVE	CONCEPTO	FOTOS

REHABILITACIÓN DE POLIDEPORTIVO CANCHA DE BASQUETBOL ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		VOLUMEN	UNIDAD
A	Suministro y colocación de Duela de Madera Deportiva con sistema flotante de alto rendimiento: se colocara una barrera de vapor a base de una película de polietileno de alta densidad de 6 mil. de espesor, se instalaran 2 camras de hojas de madera OSB o Triplay de 1.2X2X2.44m y 1/2" pulgada de espesor, la primera cama en línea y a lo largo de el area y en la parte inferior de esta se instalaran cojinetes de hule de 3/8 de peralte, esto para tener un sistema amortiguador flotante, la segunda cama de hojas se colocara a 45° de la primera, se colocara duela de maple americano de tercer grado clavada a la cama de madera por un canto a 45°, se procederá a devastar la superficie con mallas de fibra de carbon de grado 100 y 120, se aplicara una capa de sellador especial para maple a base de resinas de poliuretano, se procederá a pulir toda la superficie y a limpiarla con thinner mineral, se procederá al trazo y pintado de líneas de juego reglamentarias de la diciplina solicitada, se aplicara unas capas de poliuretano transparente brillante y antideslizando especial para areas deportivas como acabado final incluye: Duela de maple, aglomerado OSB, tornillos, lijas, thinner mineral, barniz para maple, película de polietileno, cojinetes de hule, suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta.	516.86	M2
A01			
A012			
2576-003			

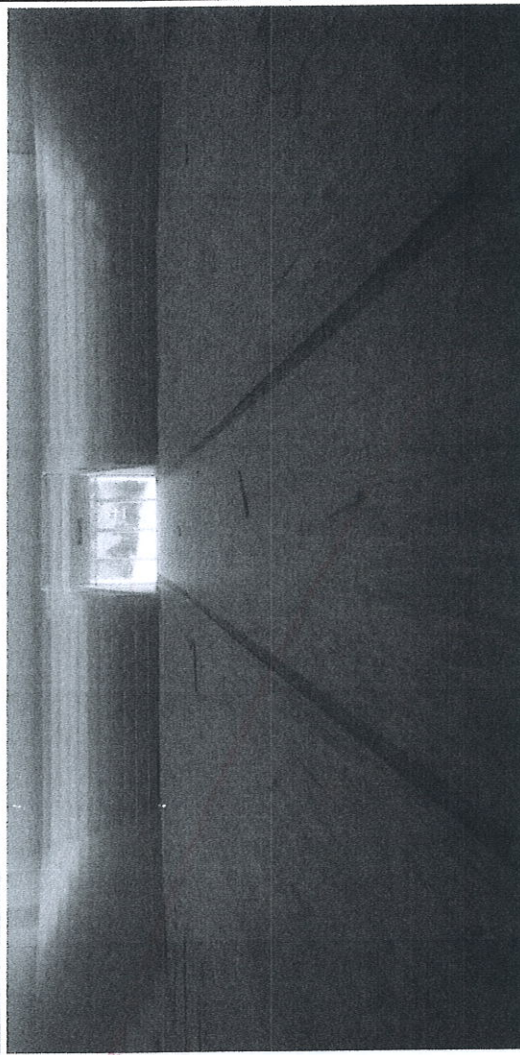

DESPUES $17^{\circ}18'42.85''N$ $96^{\circ}29'30.72''O$

17°18'44.07"N
DESPUES
96°29'29.40"O


ITHADEAR
 GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
 ADMINISTRADOR UNICO

GRUPO CONSTRUCTOR DE OAXACA S.A. DE C.V.
 AV. INSURGENTES SUR # 1000, PISO 10, SECCION 10, COL. REFORMA, CDMX 06702
 +52 (55) 52 52 52 52 +52 (998) 82 82 82 82
 +52 (998) 82 82 82 82 +52 (998) 82 82 82 82

ELABORADO POR LIC. LIBETH BAUTISTA MARTINEZ
GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

AUTORIZO:

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTA MARIA
RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

FOTOS

FOTOS



ELABORO:

REPORTE FOTOGRAFICO

Oaxaca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SUSTENTABLE.

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE CONSTRUCCION

DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

SINFRA

Secretaria de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOXO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233

GC110613477

5170983 Tel. Fax:

Numero de Hoja: 5 de 6

Monto Contratado: \$2,593,696.36

Monto del Anticipo: \$778,108.91

Monto del Convenio: Total Contratado:

Estimación Número: 02 (DOS)

Periodo de Ejecución: 01 de Enero 2019 AL 31 de Enero de 2019

Contratista: Domicilio: R.F.C. Teléfono: Fecha de Elaboración: 01 de Febrero de 2019

Periodo de Contrato: 21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019

Periodo de Convenio: Periodo de Convenio:

Obra: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Localidad: 001 GUELATAO DE JUAREZ Recurso: RAMO 10-ECONOMIA, FONDO

Municipio: 035 GUELATAO DE JUAREZ MINERO REHABILITACION DEL

Estado: 020 OAXACA, POLIDEPORTIVO

Numero de Contrato: J03-174-03-06-465-00-2018


Numero de Convenio Diferimiento:

Numero de Convenio Modificador:

CLAVE

CONCEPTO

FOTOS

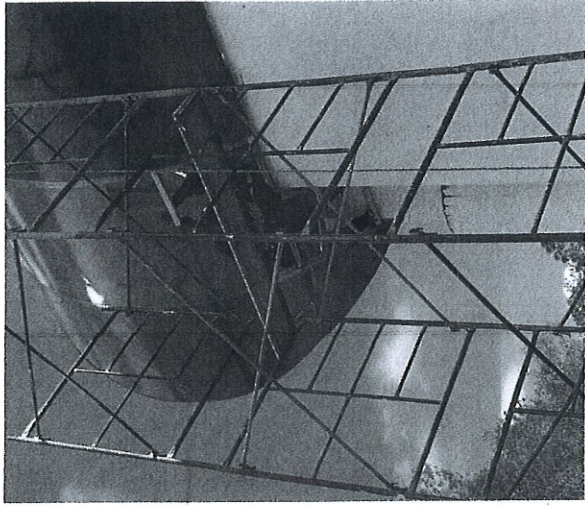CLAVE	CONCEPTO	FOTOS	VOLUMEN	UNIDAD
A02 2576-004	ADHERIDOS Reparacion de cubierta a base del sellado y ajuste de lamina pintro calibre 22 hasta una altura de 15 mts, sellado de aberturas con silicon industrial de alta temperatura, fijacion de lamina sueltas y reposicion de laminas dañadas, incluye suministro de materiales,y herramienta mano de obra, equipo y herramienta	 	421.55	M2

ELABORO:

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

MR. LUIS B. BAUTISTA MARTINEZ

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO

AUTORIZO:

ARQ. FRANCISCO CONSTRUCTION VASQUEZ SANTA MARIA


RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.

DURANTE

17°18'42.85"N 96°29'30.72"O


17°18'44.07"N 96°29'29.40"O

Obra:	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)		Contratista:	GRUPO CONSTRUCTO ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.	
Localidad:	001 GUELATAO DE JUAREZ	Recurso:	RAMO 10-ECONOMIA. FONDO MINERO REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO	Domicilio:	CALLE MORELOS No. 8, COL. PRIMERA AMPLIACION DE XOYO, SANTA CRUZ XOXCOTLAN, OAXACA, C.P. 71233
Municipio:	035 GUELATAO DE JUAREZ			R.F.C.:	GCH110613AY7
Estado:	020 OAXACA			Teléfono:	5170983 Tel. Fax:
Numero de Contrato:	J03-174-03-06-465-00-2018			Fecha de Elaboración:	01 de Febrero de 2019
Numero de Convenio Diferimiento:				Periodo de Contrato:	21 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 18 DE FEBRERO DE 2019
Numero de Convenio Modificatorio:				Periodo de Convenio:	
				Periodo de Convenio:	

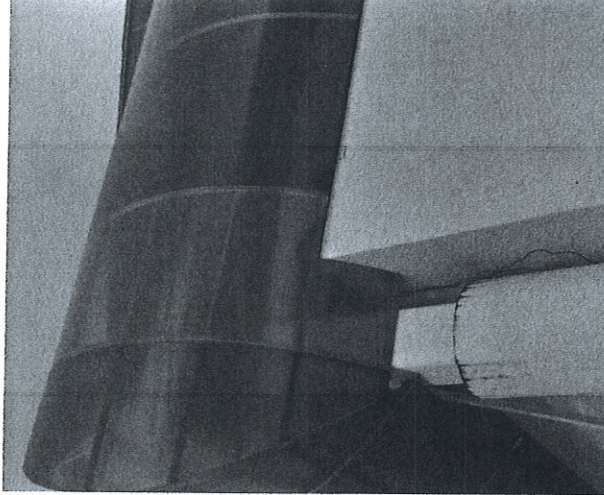CLAVE	CONCEPTO	FOTOS	VOLUMEN	UNIDAD
A02 2576-004	ADHERIDOS Reparacion de cubierta a base del sellado y ajuste de lamina pintro calibre 22 hasta una altura de 15 mts, sellado de aberturas con silicon industrial de alta temperatura, fijacion de laminas sueltas y reposicion de laminas dañadas, incluye suministro de materiales, y herramienta mano de obra, equipo y herramienta		421.55	M2

DESPUES 17°18'42.85"N 96°29'30.72"O

DESPUES 17°18'44.07"N 96°29'29.40"O

ELABORADO: 
LIC. LIZBETH GUTIERREZ MARTINEZ
GRUPO CONSTRUCTO ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNIJO

AUTORIZO: 
ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ SANTA MARIA
RESIDENTE DE OBRA POR LA S.I.O.T.S.




January 8, 2019


Ref: Commercial Invoice 35539

To Whom It May Concern:

We hereby attest the lumber has been "Kiln-dried" for 13 days and the highest temperature attained was 160 degrees for duration of 6 hours. The lumber was dried to on average 7% moisture content.

Attested by:


T. W. Abendroth
President
Action Floor Systems, LLC



The Chamber of Commerce of Mercer a recognized Chamber of Commerce under the laws of the state of Wisconsin, has examined the manufacturer's affidavit concerning the kiln drying and origin of the merchandise and, according to the best of my knowledge find that the products are as stated.


Beth Wetzler
Mercer Area Chamber of Commerce

Secretary



CERTIFICATE OF HEAT TREATMENT

Heat Treatment Provider:

Fox Valley Wood Products
W811 State Hwy 96 Kaukauna WI. 54130
920-766-1220



Customer: Action Floor Systems, LLC

Date: 8 January 2019

N/A

PO# All wooden packaging materials (PF Invoice 35539)


Description:

This documentation is to certify the material used in the manufacture of the wood packaging described above has reached a temperature of 140 degrees F 30 for minutes at the core of the material. These conditions meet the regulations required by the International Standard for Wood Packaging ISPM #15. The materials corresponding with this document must have the above stamp located on two apposing sides of the pallet / crate. All pallets, Domestic and Export are utilized using wood/raw materials that are 2,4,6 tribromomaisole(TBA) and (TBP)-free and are not from South America.

Certifying Agency:
Timber Products Inspection
PO Box 919 Conyers, GA 30012
(770-922-8000)

Signed:

Jeff Van Zeeland – Fox Valley Wood Products



FIŞĂ TEHNICĂ / TECHNICAL SHEET

PLĂCI PORTANTE PENTRU UTILIZARE ÎN MEDIU UMED OSB3 Superfinish ECO/ LOAD-BEARING BOARDS FOR USE IN HUMID CONDITIONS OSB3 Superfinish ECO

No. Crt.	Property	Unit	Thickness range (mm)					Test/ requirement standard
			6 to 10	>10 to <18	18 to 25	>25 to 32	>32 to 40	
1	Masa volumică Density	kg/m ³ ±15 %	600	590	580	570	560	EN 323 EN 300
2	Rezistenţă la încovoiere - Sens longitudinal Bending strength - Longitudinal Direction	N / mm ²	≥ 22	≥ 20	≥ 18	≥ 16	≥ 14	EN 310 EN 300
3	Rezistenţă la încovoiere - Sens transversal Bending strength - Transversal Direction	N / mm ²	≥ 11	≥ 10	≥ 9	≥ 8	≥ 7	EN 310 EN 300
4	Modul de elasticitate la încovoiere - longitudinal Modulus of elasticity in Bending - Longitudinal Direction	N/mm ²	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	≥ 3500	EN 310 EN 300
5	Modul de elasticitate la încovoiere - transversal Modulus of elasticity in Bending - Transversal Direction	N/mm ²	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	≥ 1400	EN 310 EN 300
6	Coeziune internă Internal Bond	N / mm ²	≥ 0,34	≥ 0,32	≥ 0,30	≥ 0,29	≥ 0,26	EN 319 EN 300
7	Umflare în grosime 24 h Swelling in thickness -24 h	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15	EN 317 EN 300
8	Toleranţă la dimensiuni nominale - grosime Thickness tolerances	mm	±0,8					EN 324-1 EN 300
9	Toleranţă la dimensiuni nominale - lăţime şi lungime Length and width tolerance	mm	±3,0					EN 324-1 EN 300
10	Toleranţa a rectitudinii muchiilor Edge straightness tolerance	mm/m	±1,5					EN 324-2 EN 300
11	Toleranţă a perpendicularităţii Squareness	mm/m	2,0					EN 324-2 EN 300
12	Umiditate Moisture content	%	2 to 12					EN 322 EN 300
13	Coeziune internă după încercare la apa fierbinte Internal bond after boil test	N/mm ²	0,15	0,13	0,12	0,06	0,05	EN 1087-1 EN 300
14	Emisia de aldehidă formică Formaldehyde emission	mg/100g	≤ 2					EN 12460-5 EN 300

Consultaţi arhitectul sau proiectantul dumneavoastră în privinţa stabilirii solicitărilor şi utilizării în acord cu standardele naţionale sau conform codurilor de proiectare pe baza valorilor date mai sus. Contactaţi departamentul nostru tehnic pentru detalii.

Consult your design engineer to establish applicable loadings and spans according to local standards or design codes using the above values. Contact our technical department if you have the need for more detailed information.

Lab Manager,

.....



Production Manager

.....

Características

- Tablero estructural formado por hojuelas de madera, orientadas en 3 capas perpendiculares entre sí, unidas con adhesivos fenólicos y de poliuretano.
- Tiene una de las caras texturizada para proporcionar una superficie antideslizante, que otorga mayor seguridad en la instalación.
- Contenido de humedad: entre 5% y 8%.
- Canto de color azul.

Ventajas del producto

- Resistencia estructural.
- Durable.
- Fácil y rápido de instalar
- Permite industrialización de estructuras.

Principales aplicaciones

- Muros.
- Pisos.
- Techos.
- Cierres perimetrales
- Embalajes.

OSB

Recomendaciones

- Los tableros OSB son resistentes a la humedad, lo que no significa que sean aptos para estar expuestos directamente a la acción del agua.
- Para su uso exterior, se recomienda proteger los tableros bajo alero o con recubrimientos adecuados para usar a la intemperie.
- Se recomienda acondicionar el producto en el lugar donde se instalará, para evitar deformaciones.
- Al instalar los tableros en techos inclinados, se recomienda colocar la superficie texturizada antideslizante hacia arriba. En muros y pisos aumenta la adherencia de los revestimientos de terminación.

- Se instalan con clavos o tornillos directamente a la estructura, cuidando que no queden a menos de 1 cm de los bordes.

Almacenamiento

- Almacene los tableros bajo techo, apilados de manera horizontal y apoyados sobre 3 listones como mínimo.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

BESOP

BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO
A OBRA PÚBLICA

Bitácora

Datos del contrato

Número de contrato: J03-174-03-06-465-00-2018

Objeto del contrato: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN
EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Instancia federal: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Unidad Local: SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Unidad ejecutora: DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

Empresa contratista: GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE
OAXACA S.A. DE C.V.

Fecha de inicio contractual: 21/12/2018

Fecha de término contractual: 18/02/2019

Estatus: INICIADA

Tipo de bitácora: BITÁCORA ÚNICA

Importe contractual:

Pesos	Dólares	Euros
\$2,235,945.14	\$0.00	€0.00

DEL ESTADO
A
ON
A
CIÓN

Regresar

Continuar apertura



BESOP
BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO
A OBRA PÚBLICA

Apertura de bitácora

Registrar nota

Entidad Federativa:

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Ente:

SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Unidad Ejecutora:

DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

Datos particulares del contrato

Número de Contrato:

J03-174-03-06-465-00-2018

Fecha de inicio de contrato:

21-12-2018

Fecha de término de contrato:

18-02-2019

Plazo (Días naturales):

60

Objeto del contrato:

REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO
DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

Montos

Importe	Moneda
\$2,235,945.14	MXN

Lugar donde se desarrollan los trabajos

Refere de ubicaci	Latituc	Longitu	Estado	Coloni	Delega / Munici	Localic	Fecha
AV. LAZARO CARDE	17.312	-96.491	OAXAC	GUELA DE JUAREZ	GUELA DE JUAREZ	GUELA DE JUAREZ	24/01/2

1

Logotipo

Cargar logo

Contratista

Área responsable de la ejecución de trabajos

Datos del contratista:

RFC:

GCI1106134Y7

Nombre o razón social

GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V.

Domicilio

Código postal:

71230

Estado:

OAXACA

Localidad:

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

Delegación o Municipio:

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

Colonia:

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

Calle:

MORELOS

Número exterior:

8

Número interior:

Información de contacto

Lada:

951

Teléfono:

5170983

Ext.:

Correo electrónico:

gpoconstructorithadar@gmail.com

Personal asignado



Agregar Superintendente

Superintendente

Nombre:

SAMUEL

Primer apellido:

GARCIA

Segundo apellido:

ARELLANES

Profesión:

ING. CIVIL

Número de documento de designación: *

S/N DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2018

Tipo de identificación oficial: *

CREDENCIAL DE ELECTOR

Número de la Identificación oficial: *

2427097118576

Adjuntar archivos

Nombre de archivo	Opciones
No hay archivos	

Domicilio

Código postal:

71313

Estado:

OAXACA

Localidad:

VILLA DE ZAACHILA

Delegación o Municipio:

VILLA DE ZAACHILA

Colonia:

SAN SEBASTIAN

Calle:

ZETOBAA

Número exterior:

305

Número interior:

Información de contacto

Lada:

Teléfono:

Ext.

Correo electrónico:

sam_arellanes@hotmail.com

Acuerdos

Nombre del área responsable de la ejecución de trabajos:

DEPARTAMENTO DE OBRAS ESPECIALES

Domicilio del área responsable de la ejecución de los trabajos:

Código postal: *

71295

Estado: *

OAXACA

Delegación / Municipio: *

SAN BARTOLO COYOTEPEC

Localidad:

REYES MANTECON

Colonia: *

FRACCIONAMIENTO - REYES MANTECON

Calle: *

AVENIDA GERARDO PANDAL GRALF

Número exterior: *

1

Número interior:

Información de contacto

Lada: *

951

Teléfono: *

5016900

Ext.:

Personal asignado



Agregar Residente

Residente

Nombre:

FRANCISCO CONSTANCIO

Primer apellido:

VASQUEZ

Segundo apellido:

SANTAMARIA

Profesión:

ARQ.

Número de documento de designación: *

D.C./DOE/1300-BIS/2018

Tipo de identificación oficial: *

CREDENCIAL DE ELECTOR

Número de la Identificación oficial: *

05120746833026

Adjuntar archivos

Nombre de archivo

Opciones

No hay archivos

Domicilio

Código postal:

68027

Estado:

OAXACA

Delegación o Municipio:

OAXACA DE JUAREZ

Localidad:

OAXACA DE JUAREZ

Colonia:

INFONAVIT 1RO. DE MAYO

Calle:

MARTIRES DE CANANEA MZA F CS3

Número exterior:

CS 3

Número interior:

Información de contacto

Lada:

Teléfono:

Ext.:

Correo electrónico:

stama1962@yahoo.com



Agregar Supervisor

Acuerdos

HORARIOS PARA ASENTAR NOTAS SE PODRÁN ASENTAR NOTAS DE LUNES A DOMINGO DE 00:01 A 23:59 HORAS. LA BITÁCORA ESTARÁ DISPONIBLE PARA CONSULTAS LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

PLAZO PLAZO MÁXIMO PARA LA FIRMA DE NOTAS
2 DÍAS.

LAS PARTES ACUERDAN QUE SE TENDRÁN POR ACEPTADAS LAS NOTAS UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO. ASIMISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 123, FRACCIONES VI. Y VII. DEL RLOPSRM, SE ESTABLECE QUE POR NINGUNA CAUSA SE PODRÁN MODIFICAR LAS NOTAS YA FIRMADAS, DE SER NECESARIO, SE DEBERÁ DE ABRIR UNA NOTA ACLARATORIA. **GENERADORES** LOS NÚMEROS GENERADORES SERÁN PRESENTADOS A LA RESIDENCIA CON PERIODICIDAD:

SEMANAL **QUINCENAL** ✓ **MENSUAL**

ESTIMACIONES CON FUNDAMENTO EN LA LOPSRM, ARTÍCULO 54.- LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES. EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTARLAS A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DÍA: 31 PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN EL CONTRATO, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN.

DE ACUERDO AL RLOPSRM, ARTÍCULO 132.- LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN SERÁN DETERMINADOS POR CADA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS,

COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, LOS CUALES SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: I. NÚMEROS GENERADORES; II. NOTAS DE BITÁCORA; III. CROQUIS; IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO Y FOTOGRAFÍAS; V. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; VI. AVANCES DE OBRA, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS A PRECIO ALZADO, Y VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, TRATÁNDOSE DE AMORTIZACIONES PROGRAMADAS.)

CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 105 DEL RLOPSRM.- SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUCENTE. EL CONTRATISTA SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. CUANDO SEA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LA QUE REQUIERA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTOS DEBERÁN SER AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LA BITÁCORA POR EL RESIDENTE. A LOS PRECIOS UNITARIOS GENERADOS PARA LOS REFERIDOS CONCEPTOS SE DEBERÁN APLICAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 102 DE ESTE REGLAMENTO.

SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LOPSRM, ARTÍCULO 20.-LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTARÁN OBLIGADAS A CONSIDERAR LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE QUE PUEDA CAUSAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS CON

SUSTENTO EN LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTA POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LOS PROYECTOS DEBERÁN INCLUIR LAS OBRAS NECESARIAS PARA QUE SE PRESERVEN O RESTITUYAN EN FORMA EQUIVALENTE LAS CONDICIONES AMBIENTALES CUANDO ÉSTAS PUDIEREN DETERIORARSE Y SE DARÁ LA INTERVENCIÓN QUE CORRESPONDA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE TENGAN ATRIBUCIONES EN LA MATERIA. Otras Anotaciones

VERIFICACIÓN JURÍDICA CERTIFICADO

 Vista Previa

 Firmar

 Regresar

 Anterior

NOTA NO. 005

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 02/ENERO/2019

LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE OAXACA INDICA A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EL DÍA DE HOY SE DA INICIO CON LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUELA DE MADERA DEPORTIVA CON SISTEMA FLOTANTE DE ALTO RENDIMIENTO, SE COLOCARA UNA BARRERA DE VAPOR A BASE DE UNA PELICULA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6 MIL. DE ESPESOR POR LO QUE SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA.

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 006

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 05/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN INFORMA QUE AL DIA DE HOY SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA BARRERA DE VAPOR A BASE DE UNA PELICULA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6 MIL. PARA PODER INSTALAR DE MANERA POSTERIOR LAS PLACAS DE OSB EN TODA LA CANCHA DE BASQUET BOL.

POR LO QUE SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARIZANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 007

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 08/ENERO/2018

CON ESTA NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA UN RECORRIDO A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA SUPERVISAR QUE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SEA EL CORRECTO DE ACUERDO AL PROYECTO, POR LO QUE SE CONCLUYE CON LA INSTALACION DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA BARRERA DE VAPOR A BASE DE UNA PELICULA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 6 MIL. PARA PODER INSTALAR DE MANERA POSTERIOR LAS PLACAS DE OSB SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 1 CAMA DE HOJA DE MADERA OSB O TRIPLAY DE 1.22X2.44M Y 1/2" PULGADA DE ESPESOR, LA PRIMERA CAMA EN LINEA Y A LO LARGO DE EL AREA Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA SE INSTALARÁN COJINETES DE HULE DE 3/8 DE PERALTE, ESTO PARA TENER UN SISTEMA AMORTIGUADOR FLOTANTE,

SIN MAS POR EL MOMENTO SE SIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 09: 45 HORAS DEL MISMO DIA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 008

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 10/ENERO2019

CON ESTA FECHA LA SUPERINTENDENCIA DE OBRA INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE 1 CAMA DE HOJA DE MADERA OSB DE 1.22X2.44M Y 1/2" PULGADA DE ESPESOR, LA PRIMERA CAMA EN LINEA Y A LO LARGO DE EL AREA Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTA SE INSTALARAN COJINETES DE HULE DE 3/8 DE PERALTE, ESTO PARA TENER UN SISTEMA AMORTIGUADOR FLOTANTE

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 15:25 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 009

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NUMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 15/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA RECORRIDO A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL DÍA DE HOY SE LLEVEN A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO POR LO QUE SE ASI MISMO CON ESTA FECHA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA CAMA DE HOJAS DE OSB SE COLOCARA A 45° DE LA PRIMERA.

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 17:05 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 010

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 18/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA RECORRIDO A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL DÍA DE HOY SE LLEVEN A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO POR LO QUE SE ASI MISMO CON ESTA FECHA REPORTA UN AVANCE DE 100% PORCIENTO EN LA COLOCACION DE LA SEGUNDA CAMA DE HOJAS SE COLOCARA A 45° DE LA PRIMERA, CAMA DE HOJA DE MADERA OSB DE 1.22X2.44M Y 1/2" PULGADA DE ESPESOR. ASI MISMO SE INICIA CON LA COLOCACIÓN DE DUELA DE MAPLE AMERICANO DE TERCER GRADO CLAVADA A LA CAMA DE MADERA POR UN CANTO A 45°

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 12:23 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 011

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 21/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA RECORRIDO A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL DÍA DE HOY SE LLEVEN A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO POR LO QUE SE ASÍ MISMO CON ESTA FECHA REPORTA UN AVANCE DE 50% PORCIENTO EN LA COLOCACION DE DUELA DE MAPLE AMERICANO DE TERCER GRADO CLAVADA A LA CAMA DE MADERA POR UN CANTO A 45°

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 15:25 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 012

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 24/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA RESIDENCIA DE OBRA REALIZA RECORRIDO A EL LUGAR DE LOS TRABAJOS A FIN DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS EJECUTADOS HASTA EL DÍA DE HOY SE LLEVEN A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO POR LO QUE SE ASI MISMO CON ESTA FECHA REPORTA UN AVANCE DE 60% PORCIENTO EN LA COLOCACION DE DUELA DE MAPLE AMERICANO DE TERCER GRADO CLAVADA A LA CAMA DE MADERA POR UN CANTO A 45°

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 013

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 29/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE CONCLUYEN CON LOS TRABAJOS DE REPARACION DE CUBIERTA A BASE DEL SELLADO Y AJUSTE DE LAMINA PINTRO CALIBRE 22 HASTA UNA ALTURA DE 15 MTS, SELLADO DE ABERTURAS CON SILICON INDUSTRIAL DE ALTA TEMPERATURA, FIJACION DE LAMINAS SUELTAS Y REPOSICION DE LÁMINAS DAÑADAS

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA.

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

NOTA NO. 014

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

NÚMERO DE CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018

FECHA: 31/ENERO/2019

CON ESTA FECHA LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIÓN INFORMA QUE EL DIA DE HOY SE PRESENTO LA ESTIMACION NUMERO 2 PARA SU AUTORIZACION TODA VES QUE SE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 65 % DE LA OBRA POR LO QUE SE PROCEDE AL RECORRIDO Y VERIFICACION DE LOS VOLUMNES EJECUTADOS HASTA ES MOMENTO Y SE AUTORIZA LA ESTIMACION NUMERO DOS.

SE CIERRA LA PRESENTE NOTA SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO.

ARQ. FRANCISCO CONSTANTINO VASQUEZ
SANTAMARIA
RESIDENTE DE OBRA

ING. SAMUEL GARCIA ARELLANES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Secretaria de las Infraestructuras
Direccion de Construccion
Departamento de Obras Especiales

Oaxaca
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO



SINFRA
Secretaria de Infraestructura y Gobierno Territorial Sustentable

REPORTE DE OBRA

FECHA: 31 DE ENERO DE 2019

PARA : ARQ. MARINO EDGAR OSORIO CRUZ
Jefe de departamento de Sinfra
DE: ARQ. FRANCISCO C. VASQUEZ SANTAMARIA
Supervisor

firma

OBRA: REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ (TERCERA ETAPA)

CONTRATO: J03-174-03-06-465-00-2018
CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR IHADAR DE OAXACA S.A DE C.V
MONTO CONTRATADO: \$ 2,593,696.36
FECHA DE INICIO: 21 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINO: 18 DE FEBRERO DE 2019

LOCALIDAD: 001 GUELATAO DE JUAREZ
MUNICIPIO: 035 GUELATAO DE JUAREZ

FECHA DE INICIO DIFERIDO: NO APLICA
FECHA DE TERMINO DIFERIDO: NO APLICA

AVANCE FISICO: 65.00%

PARTIDA A0101) PRELIMINARES
PARTIDA A0102) ALBAÑILERIA Y ACABADOS
PARTIDA A02) ADHERIDOS

% PROGRAMADO	% REAL	% DIFERENCIA
3.36%	0.00%	3.36%
% PROGRAMADO	% REAL	% DIFERENCIA
92.93%	58.48%	34.45%
% PROGRAMADO	% REAL	% DIFERENCIA
3.71%	1.88%	1.83%

PERSONAL EN OBRA:

- 1.- OFICIAL INSTALADOR
- 2.- 3 AYUDANTES DE INSTALADOR
- 3.- OFICIAL HERRERO
- 4.- AYUDANTE DE HERRERO
- 5.-



MAQUINARIA Y/O EQUIPO EN OBRA:

- 1.- PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVOS
- 2.- 2 COMPRESORES DE AIRE
- 3.-
- 4.-
- 5.-

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO

REPORTE FOTOGRAFICO

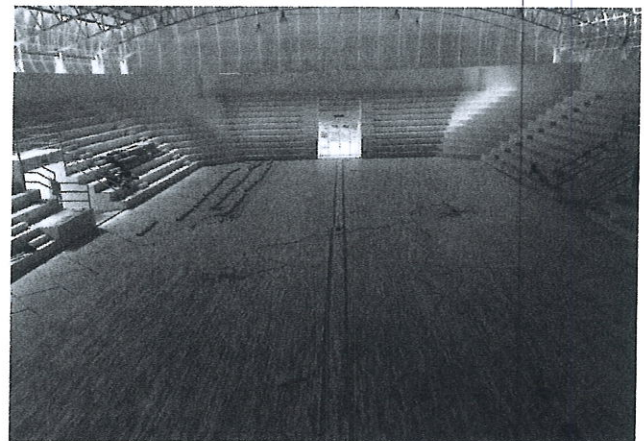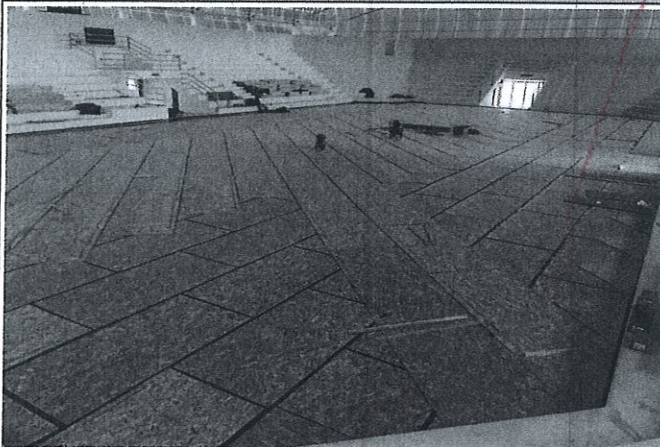


ESTACION: VISTA ESTE
GEOREFERENCIA: 17°18'44.07"N 96°29'29.40"O
DESCRIPCION: CAMA DE MADERA

ESTACION: VISTA OESTE
GEOREFERENCIA: 17°18'44.07"N 96°29'29.40"O
DESCRIPCION: INSTALACION DE DUELA

De conformidad con lo establecido en los artículos 5, numeral 1, 1.0.2. y 34, fracción XIV, del Reglamento Interno de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable. - - - - -

- - - - - CERTIFICO: - - - - -

Que el presente legajo compuesto de cuarenta y siete fojas útiles, relativo a documentación de la obra Rehabilitación de Polideportivo en el Municipio de Guelatao de Juárez (Tercera Etapa), Oaxaca, Num. De Contrato J03-174-03-06-465-00-2018; es copia fiel y exacta reproducción de su original, mismo que tuve a la vista que fue debidamente cotejado y que obra bajo resguardo Dirección de Control y Evaluación de Obra Pública de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable.- En Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve .- - - - -



SINFRA
DIRECCIÓN
JURÍDICA

C. José Francisco Bautista López.
Director Jurídico.
