

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
								A					B	A+B	d				e	f	
1	SAN LORENZO CACAOTEPEC	SAN LORENZO CACAOTEPEC	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (HUJUAPAN-OAXACA)SAN LORENZO CACAOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 3+000 (AMBOS CARRILES)	SF/SPIP/DPIP/AOPI /0154/2020	15/05/2020	5010011271800119-	30535	1,517,796.00	0.00	CAO-AOPI-005-W-0-2020	17/06/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020	16/10/2020	120	1,516,227.30	0.00	1,516,227.30	01/05/2020	30/09/2020	4
2	VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA (BACHEO A PRESION).	SF/SPIP/DPIP/AOPI /0155/2020	15/05/2020	5010011271900219-	30536	2,312,832.00	0.00	CAO-AOPI-006-W-0-2020	17/06/2020	GREEN PATCHER MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	19/06/2020	16/10/2020	120	2,310,441.60	0.00	2,310,441.60	01/05/2020	30/09/2020	4
								3,830,628.00	0.00				3,826,668.90	0.00	3,826,668.90						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Marjano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion
Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

Arq. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: AEAAA0520 ASIGNACION ORDINARIA PARA LA INVERSION (AOPI) 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y z)	Total						
1	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0154/2020	5010011271800119-	30535	3.00	1,517,796.00	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	0.00	0.00									
2	SF/SPIP/DPIP/AOPI/0155/2020	5010011271900219-	30536	3.00	2,312,832.00	KILOMETROS	3.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
					3,830,628.00		6.00	0.00	0%	0.00	0%													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable


Director de Obras



Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo



C.P. Carlos Gueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
					a				T				A	B	A+B	d	e	f			
1	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 9 RETROEXCAVADORAS	SF/SPIP/DPIP/CBN B/0134/2020	12/05/2020	5010011519800220	30490	18,467,265.81	5,011,200.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	18,467,265.81	01/05/2020	31/10/2020	5	
2	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 2 TRACTORES DE CADENA	SF/SPIP/DPIP/CBN B/0135/2020	12/05/2020	5010011519800220	30489	16,177,313.74	4,454,400.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	16,177,313.74	01/05/2020	31/10/2020	5		
3	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGA	SF/SPIP/DPIP/CBN B/0136/2020	12/05/2020	5010011519800220	30491	49,162,719.01	13,694,577.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	49,162,719.01	01/05/2020	31/10/2020	5		
4	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	ADQUISICION DE 11 EXCAVADORAS DE ORUGA	SF/SPIP/DPIP/CBN B/0137/2020	12/05/2020	5010011519800420	30492	50,277,900.98	14,094,000.00	EN PROCESO DE CONTRATACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	50,277,900.98	01/05/2020	31/10/2020	5		
								134,085,199.54	37,254,177.00							0.00	134,085,199.54				

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica

Lic. Fernando Felipe Aranda Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABBA1120 CREDITO BANOBRAS 137 MDP (IPP) 2020

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
														De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)	%	\$	%	Generados (y)				Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y z)
1	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0134/2020	5010011519800220	30490	1 ADQUISICION	18,467,265.81	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO	465.67	0.00									
2	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0135/2020	5010011519800220	30489	1 ADQUISICION	16,177,313.74	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
3	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0136/2020	5010011519800220	30491	1 ADQUISICION	49,162,719.01	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
4	SF/SPIP/DPIP/CBNS/0137/2020	5010011519800420	30492	1 ADQUISICION	50,277,900.98	ADQUISICION DE MAQUINARIA	1 ADQUISICION	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
					134,085,199.54			0.00	0%	0.00	0%													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Irg. Gildardo Arturo Elorza Flores


Elaboró con información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director Administrativo



C. Carlos Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020


Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
1	SANTIAGO TETEPEC	SAN LUIS CHATAÑU	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL-SAN LUIS CHATAÑU DEL KM 0+000 AL KM 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100120	30070	494,732.18	494,732.18	CAO-FISE-001-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	493,893.15	0.00	493,893.15	01/03/2020	31/05/2020	2
2	SANTIAGO TETEPEC	SANTA CRUZ TIHUIXTE	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU-SANTA CRUZ TEHUIXTE DEL KM 0+000 AL KM 6+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100320	30071	499,397.13	499,397.13	CAO-FISE-002-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,612.21	0.00	498,612.21	01/03/2020	31/05/2020	2
3	SANTIAGO TETEPEC	OCOTLAN DE JUAREZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUIS CHATAÑU - OCOTLAN DE JUAREZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100420	30072	497,064.65	497,064.65	CAO-FISE-003-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	496,761.62	0.00	496,761.62	01/03/2020	31/05/2020	2
4	SANTIAGO TETEPEC	GUADALUPE DEL TAMBOR	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ISIDRO DEL PARRAL - LASOLEDAD CARRIZO-GUADALUPE DEL TAMBOR DEL KM 0+000 AL KM 8+000.	SF/SPIP/DPIP/FISE/0038/2020	13/03/2020	5010011376100520	30073	499,479.38	499,479.38	CAO-FISE-004-W-0-2020	16/04/2020	GRUPO FORMADO POR: INTERSTEEL STRUCTURES, S.A. DE C.V. Y CORPORACION INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO, S.A. DE C.V.	17/04/2020	31/05/2020	45	498,815.83	0.00	498,815.83	01/03/2020	31/05/2020	2
								1,990,673.34	1,990,673.34				1,988,082.81								

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación



Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones



Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion
Publica



Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable


Director de Obras



Ing. José Casimiro Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo



C. P. Carlos Rueda Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: BEACA0219 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:									
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)		
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)					%	\$	%			Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y z)	Total					
1	SF/SP/PI/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100120	30070	6.00	494,732.18	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	369,746.24	75%	N/A	PROCESO	143.44	101.00								
2	SF/SP/PI/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100320	30071	6.00	499,397.13	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	374,191.63	75%	N/A	PROCESO										
3	SF/SP/PI/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100420	30072	6.00	497,064.65	KILOMETROS	6.00	6.00	100%	372,112.20	75%	N/A	PROCESO										
4	SF/SP/PI/DPI P/FISE/0038/2020	5010011376100520	30073	8.00	499,479.38	KILOMETROS	8.00	8.00	100%	373,172.82	75%	N/A	PROCESO										
				26.00	1,990,673.34		26.00	26.00	100%	1,489,222.89	75%												

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Borza Flores

Elaboró con información recibida del Area responsable
 Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversion Pública

Lic. Fernando Felipe Arandia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Medina Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020

Nº	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													a	T	A				B	A+B	d
1	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	AMPLIACION DEL CAMINO BARRIO SAN MIGUEL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-CAMPO DE AVIACION DEL KM 0+000 AL KM 5+000, SUBTRAMO DEL KM 0+100 AL KM 0+200 DEL KM 0+500 AL KM 0+900 CON CONCRETO HIDRAULICO Y DEL KM 3+000 AL KM 5+000 CON CONCRETO ASFALTICO (ACCESO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 34 DE TLAXIACO) EN MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO (SEGUNDA ETAPA).	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0102/2020	11/05/2020	5010011515700120	30457	5,737,308.08	0.00	CAO-CS1000MDP-007-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CONAM, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/12/2020	180	5,014,155.91	0.00	5,014,155.91	01/05/2020	31/10/2020	5
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA-TETELA DEL KM 15+000 AL KM 21+500 EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0114/2020	11/05/2020	5010011515900120	30469	31,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-008-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA JEALTRA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	30,373,181.93	0.00	30,373,181.93	01/05/2020	31/12/2020	7
3	CUILAPAM DE GUERRERO	CUILAPAM DE GUERRERO	MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CAMINO FERROCARRIL DEL 0+000 AL KM 1+500, CARRETERA OAXACA-XOXOCOTLAN DEL KM 1+500 AL KM 3+100 CAMINO PORFIO DIAZ DEL KM 3+100 AL KM 3+600 OAXACA-ZAACHILA DEL KM 3+600 AL KM 6+600 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN-CUICATLAN DE GUERRERO DEL KM 6+600 AL 11+0000 EN LOS MUNICIPIOS DE OAXACA DE JUAREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN Y CUILAPAM DE GUERRERO.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0115/2020	11/05/2020	5010011516000120	30470	10,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-009-W-0-2020	18/06/2020	TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,498,507.09	0.00	9,498,507.09	01/05/2020	31/12/2020	7
4	SANTIAGO XIACUI	SANTIAGO XIACUI	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (TUXTEPEC-OAXACA) IXTLAN DE JUAREZ-VILLA TALEA DE CASTRO DEL KM 12+000 AL KM 17+350 EN LOS MUNICIPIOS DE NATIVIDAD Y SANTIAGO XIACUI	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0116/2020	11/05/2020	5010011516100120	30471	31,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-010-W-0-2020	18/06/2020	ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ANTONIO'S, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	27,899,447.60	0.00	27,899,447.60	01/05/2020	31/12/2020	7
5	SANTA MARIA LACHIXIO	SANTA MARIA LACHIXIO	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (OAXACA-PUERTO ESCONDIDO) SAN SEBASTIAN DE LAS GRUTAS-SAN VICENTE LACHIXIO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 22+000, PRINCIPAL DEL KM 22+000 AL KM 24+600, SAN VICENTE LACHIXIO-SANTA MARIA LACHIXIO DEL KM 24+600 AL KM 26+100 CARRETERA SIN NOMBRE DEL KM 26+100 AL KM 31+500, EN LOS MUNICIPIOS LA COMPAÑIA AYOQUEZCO DE ALDDAMA VILLA SOLA DE VEGA, SAN VICENTE LACHIXIO Y SANTA MARIA LACHIXIO.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0117/2020	11/05/2020	5010011516200120	30472	18,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-011-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO CONSTRUCTOR PADIHESA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	16,499,699.95	0.00	16,499,699.95	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020


Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa					
								T					Inicio	Conclusión	No. de Días				A	B	A+B	Inicio	Conclusión	No. de Meses
								a					d	e	f									
6	SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	MEJORAMIENTO DE HUAJUAPAN-SAN MARCOS ARTEAGA-SAN AGUSTIN ATENANGO-SAN MIGUEL TLACOTEPEC- SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA-SANTIAGO JUXTLAHUACA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 100+000, SUBTRAMO HUAJUAPAN-TLACOTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 80+000 TRAMOS DIVERSOS.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0118/2020	11/05/2020	5010011516300120	30473	18,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-012-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR MARAGALL, S.A. DE C.V. Y DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN, PRESTACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS GRUPO JUÁREZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	17,998,757.99	0.00	17,998,757.99	01/05/2020	31/12/2020	7			
7	SAN PEDRO POCHUTLA	SAN PEDRO POCHUTLA	RECONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO POCHUTLA DEL KM 0+000 AL KM 5+300, TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO POCHUTLA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0119/2020	11/05/2020	5010011516400120	30474	21,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-013-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO KOIS, S.A. DE C.V. Y GRUPO CELMARN, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	18,457,761.67	0.00	18,457,761.67	01/05/2020	31/12/2020	7			
8	SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SALADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0120/2020	11/05/2020	5010011516500120	30475	12,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-014-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: SISTEMAS ESPECIALES DE METALIZACIÓN SANFER, S.A. DE C.V. E INBISA ARQUITECTURA BÁSICA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	11,979,493.66	0.00	11,979,493.66	01/05/2020	31/12/2020	7			
9	SANTA MARIA CHIMALAPA	SANTA MARIA CHIMALAPA	CONSERVACION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ)SANTA MARIA CHIMALAPA DEL KM 14+000 AL KM 50+500 EN SUBTRAMOS DIVERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE ASUNCION IXTALTEPEC Y SANTA MARIA CHIMALAPA.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0121/2020	11/05/2020	5010011516600120	30476	14,800,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-015-W-0-2020	18/06/2020	CORPORATIVO ALIALERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	14,204,248.05	0.00	14,204,248.05	01/05/2020	31/12/2020	7			
10	SANTO DOMINGO ARMENTA	SANTO DOMINGO ARMENTA	RECONSTRUCCION DE CAMINO INDEPENDENCIA DEL KM 5+500 AL KM 6+100, CAMINO ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL KM 6+100 AL KM 7+200 Y EL E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPANACIONAL) SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 7+200 AL KM 12+200 EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPANACIONAL Y E.C. (LAS CRUCES-PINOTEPANACIONAL)SANTO DOMINGO ARMENTA-SANTIAGO TAPEXTLA DEL KM 12+200 AL KM 17+700 EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0122/2020	11/05/2020	5010011516700110	30477	25,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-016-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: TECNOURBANISTAS MONTEVERDE, S.A. DE C.V. Y CONSULTORES DE LA CUENCA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,900,006.80	0.00	24,900,006.80	01/05/2020	31/12/2020	7			

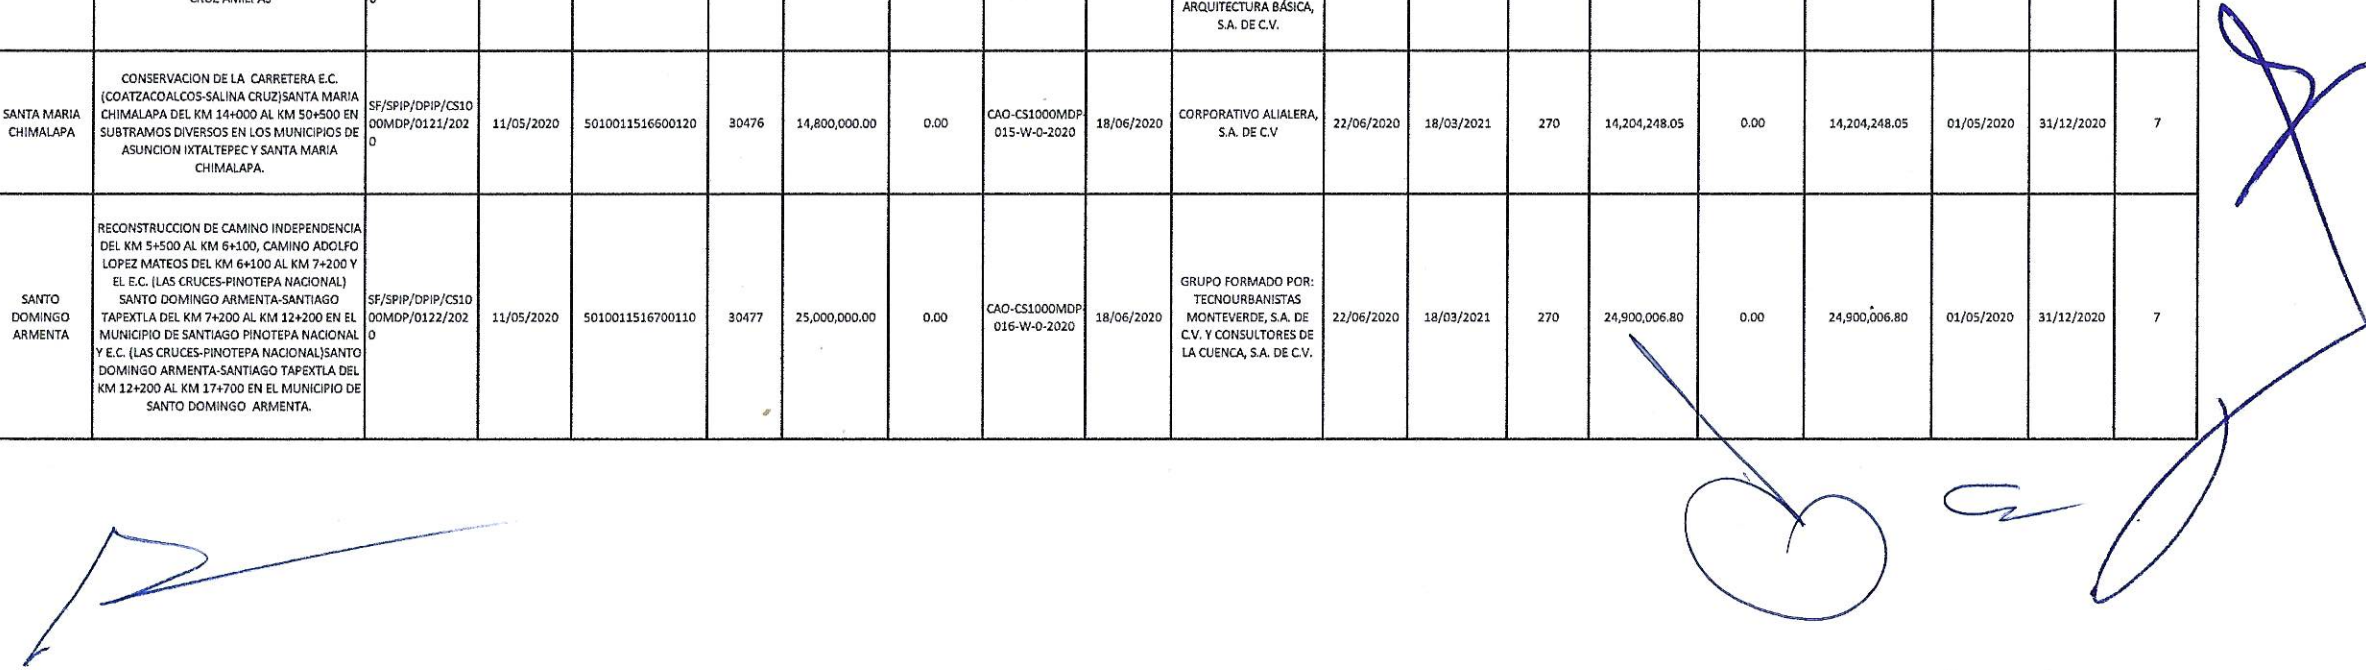

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													T	A	B				A+B	d	e
11	SANTO TOMAS OCOTEPEC	SANTO TOMAS OCOTEPEC	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (TLAXIACO PUTLA) R/O OCOTEPEC-SANTA MARIA YUCUITE, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 42+000, SUBTRAMO DEL KM 3+500 AL KM 21+000 EN UNA PRIMERA ETAPA SERIA EL TRAMO DEL KM 3+500 AL KM 7+000.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0123/2020	11/05/2020	5010011516800120	30478	14,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-017-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO CONSTRUCTOR SERVITRAC, S.A. DE C.V. E INGENIERIA DE CARRETERAS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	12,901,424.10	0.00	12,901,424.10	01/05/2020	31/12/2020	7
12	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA TLAXIACO-SAN MIGUEL EL GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS PARCIALES.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0124/2020	11/05/2020	5010011517800120	30479	27,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-018-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA PZ, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	24,511,393.26	0.00	24,511,393.26	01/05/2020	31/12/2020	7
13	GUADALUPE DE RAMIREZ	GUADALUPE DE RAMIREZ	CONSERVACION DE LA CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON-MARISCALA DE JUAREZ DEL KM 10+000 AL KM 80+200 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA, SAN JOSE AYUQUILA-SAN MIGUEL AMATITLAN, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SAN NICOLAS HIDALGO Y GUADALUPE DE RAMIREZ.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0125/2020	11/05/2020	5010011517900120	30480	10,500,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-019-W-0-2020	18/06/2020	TECAMIX, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	9,999,134.51	0.00	9,999,134.51	01/05/2020	31/12/2020	7
14	SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (YUCUDAA-PINOTEPA NACIONAL)-TLACAMAMA DEL KM 0+000 AL KM 3+000, TLACAMAMA-SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 5+000 AL KM 6+400, SAN PEDRO JICAYAN-PINOTEPA DE DON LUIS DEL KM 14+200 AL KM 15+800 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL TLACAMAMA Y SAN PEDRO JICAYAN	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0126/2020	11/05/2020	5010011518100120	30481	21,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-020-W-0-2020	18/06/2020	GRUPO FORMADO POR: GRUPO OMESA DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y OPERADORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	19,144,512.08	0.00	19,144,512.08	01/05/2020	31/12/2020	7
15	SAN GABRIEL MIXTEPEC	SAN GABRIEL MIXTEPEC	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA T.C. (OAXACA-PUERTO ANGEL)- PUERTO ESCONDIDO DEL KM 171+111 AL KM 175+000 AL KM 183+750 AL KM 202+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN LACHAO, SAN JERONIMO COATLAN Y SAN GABRIEL MIXTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0127/2020	11/05/2020	5010011520900120	30482	70,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-021-W-0-2020	18/06/2020	INGENIERIA, CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	69,789,389.17	0.00	69,789,389.17	01/05/2020	31/12/2020	7

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													A	B	A+B				d	e	f
16	CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA TLAXIACO-CHALCATONGO DE HIDALGO DEL KM 51+200 AL KM 57+950, INDEPENDENCIA DEL KM 57+930 AL KM 58+300, LIBRAMIENTO ANASTACIO BUSTAMANTE DEL KM 58+300 AL KM 58+500, CUAUHEMOC DEL KM 58+500 AL KM 58+850, MATAMOROS DEL KM 58+850 AL KM 59+250, LAZARO CARDENAS DEL KM 59+250 AL KM 59+500, INSURGENTES DEL KM 59+500 AL KM 59+750, CHALCATONGO DE HIDALGO-SANTIAGO YOSONDUA DEL KM 59+750 AL KM 60+000 EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA TICUA Y CHALCATONGO DE HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0128/2020	11/05/2020	5010011521000120	30488	33,000,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-022-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA CRUZER, S.A. DE C.V.	22/06/2020	18/03/2021	270	28,417,361.89	0.00	28,417,361.89	01/05/2020	31/12/2020	7
17	MATIAS ROMERO AVENDAÑO	COLONIA CUAUHEMOC	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADOS DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM. 17+500 AL KM 17+660, EN EL MUNICIPIO MATIAS ROMERO AVENDAÑO.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0131/2020	11/05/2020	5010011518000120	30485	6,500,000.00	0.00	CAO-CS1000MDP-023-W-0-2020	18/06/2020	HACHE BSF, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	5,882,586.85	0.00	5,882,586.85	01/05/2020	31/12/2020	7
18	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0132/2020	11/05/2020	5010011529500120	30486	2,956,315.20	0.00	CANCELADA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	01/05/2020	31/12/2020	7	
19	HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SIMONA ROBLES (COLONIA)	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUCHITAN DE ZARAGOZA-UNION HIDALGO DEL KM 0+000 AL KM 8+000 DEL MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0163/2020	11/05/2020	50100115294	30581	30,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	30,000,000.00	01/05/2020	31/12/2020	7	
20	SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN NOMBRE DEL KM 25+500 AL KM 29+200 ZACATEPEC-SANTA CATARINA JUQUILA DEL KM 29+200 AL KM 35+000 EN TRAMOS PARCIALES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0177/2020	26/05/2020	5010011529000120	30749	17,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	17,000,000.00	01/06/2020	31/12/2020	7	
21	PLUMA HDALGO	COPALITA	CONSERVACION DE LA CARRETERA EL APOTE-COPALITA DEL KM 10+000 AL KM 34+600 EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO POCHUTLA Y PLUMA HIDALGO	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0178/2020	26/05/2020	5010011534100120	30750	14,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	14,000,000.00	01/06/2020	31/12/2020	7	

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:

JUNIO

Fecha de Elaboración:

05 DE JULIO DE 2020

N°	Municipio	Localidad	Proyecto	Oficio de Autorización	Fecha de Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Monto Autorizado	Monto ministrado al ejecutor	Número del Contrato	Fecha de Contrato	Constructora	Calendario de Ejecución según contrato			Monto del Contrato	Gastos Indirectos	Monto Comprometido	Calendario de Ejecución del Convenio o Vigencia del Programa		
													Inicio	Conclusión	No. de Días				Inicio	Conclusión	No. de Meses
													T	A	B				A+B	d	e
22	SAN JOSE CHILTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	AMPLIACION DEL CAMINO SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 1+700 DEL MUNICIPIO SAN JOSE CHILTEPEC.	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0181/2020	26/05/2020	5010011531500120	30753	13,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	13,000,000.00	01/06/2020	31/12/2020	7		
23	SAN JUAN GUICHICOVI	BOCA DEL MONTE	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (COATZACOALCOS-SALINA CRUZ) LA ESMERALDA (LIMITE ESTADO DE OAXACA-VERACRUZ) DEL KM 1+000 AL KM 6+000 DEL MUNICIPIO SAN JUAN GUICHICOVI	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0182/2020	26/05/2020	5010011529300120	30754	29,000,000.00	0.00	EN PROCESO DE LICITACION	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	29,000,000.00	01/06/2020	31/12/2020	7		
24	OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	RECONSTRUCCION DE CARRETERA CAMINO RIVERAS DEL ATOYAC KM 3+000 AL KM 4+850 CONSTITUYENTES KM 4+850 AL KM 6+000, EN TRAMOS PARCIALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JACINTO AMILPAS Y OAXACA DE JUAREZ (1A. ETAPA)	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0190/2020	28/05/2020	5010011529500120	30758	2,956,315.20	0.00	CAO-CS1000MDP-024-W-0-2020	18/06/2020	CONSTRUCTORA DE MULTISERVICIOS VICTORIA, S.A. DE C.V.	22/06/2020	17/01/2021	210	2,954,503.53	0.00	2,956,315.20	01/05/2020	31/12/2020	7
								477,449,938.48	0.00				350,425,566.04	0.00	453,427,377.71						

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Eloza Flores

Jefe de la Unidad de Licitaciones

Arq. Carlos Mariano Rios Limeta

Elaboró con información recibida del
Área responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión
Pública

Lic. Fernando Felipe Arándia Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castulo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.P. Carlos Rosales Ayala

Dependencia Ejecutora: CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

Fuente de Financiamiento: ABAAA1620 CREDITO SANTANDER 1000MDP 2020

Mes que Reporta:
JUNIO
Fecha de Elaboración:
05 DE JULIO DE 2020

N°	Oficio de Autorización	PIPETAPA	ID Obra	Programado		Unidad de Medida	Metas		Avance al Mes Reportado			Sistema RFT		PARA REPORTAR LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO SERÁ NECESARIO ADICIONAR LO SIGUIENTE:										
				Avance Físico	Avance Financiero		Programada	Alcanzada	Avance Físico Alcanzado	Avance Financiero Pagado	Avance Financiero Pagado	NO. Folio	Estatus	Rendimientos		Monto Reintegrado			Institución Bancaria	Fecha de Reintegro	Comprobante de Reintegro. SPEI Clave de Rastreo (Adjuntar)			
				De acuerdo a Calendario de Ejecución del Convenio (d-e-f)			%	\$	%	Generados (y)	Ejercidos (z)	Recursos remanentes	Rendimiento (y z)	Total										
16	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0128/2020	5010011521000120	30488	8.80	33,000,000.00	KILOMETROS	8.80	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
17	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0131/2020	5010011518000120	30485	160.00 ML.	6,500,000.00	METROS LINEALES	160.00 ML.	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
18	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0132/2020	5010011529500120	30486	2.50	2,956,315.20	KILOMETROS	2.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	CANCELADA											
19	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0163/2020	50100115294	30581	8.00	30,000,000.00	KILOMETROS	8.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
20	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0177/2020	5010011529000120	30749	3.25	17,000,000.00	KILOMETROS	3.25	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
21	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0178/2020	5010011534100120	30750	24.60	14,000,000.00	KILOMETROS	24.60	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
22	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0181/2020	5010011531500120	30753	1.70	13,000,000.00	KILOMETROS	1.70	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
23	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0182/2020	5010011529300120	30754	5.00	29,000,000.00	KILOMETROS	5.00	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
24	SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0190/2020	5010011529500120	30758	2.50	2,956,315.20	KILOMETROS	2.50	0.00	0%	0.00	0%	N/A	PROCESO											
SUMAS				272.26	477,449,938.48		272.26	0.00	0%	0.00	0%													

NOTA: La fecha límite para comprometer el recurso es de 90 días posteriores a la fecha del Oficio de de Autorización o Notificación (en su caso).

La veracidad de la información reportada queda a cargo de la Dependencia Ejecutora, misma que es congruente y coincide con la documentación comprobatoria y justificativa que obra en esta dependencia, así como con los reportes y demás información que a sido enviada, así como el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos 70 de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 23A de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca, 163 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y demás disposiciones aplicables; así mismo el resguardo y custodia de la documentación justificativa y comprobatoria que se origine, misma que se encontrará a disposición de los órganos de control y fiscalización Federales y Estatales.

Vo. Bo.

Director de Planeación

Ing. Gildardo Arturo Elorza Flores

Elaboró con Información recibida del Area responsable
Jefe del Depto. de Seguimiento de la Inversión Publica

Lic. Fernando Felipe Arandía Valencia

Director de Área Responsable

Director de Obras

Ing. José Castillo Castellanos Arenas

Director de Área Responsable

Director Administrativo

C.R. Carlos Rueda Ayala
